

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FORTASEG 001/18 COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, GARITA Y ESTACIONAMIENTO COMANDANCIA)

Ubicación: CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO,
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de
Seguridad Pública (FORTASEG 2018)

Contrato: FORTASEG 001/18

Tipo de inversión:

Programa: DA EDIFICIOS PÚBLICOS

Subprograma: 03 Construcción

Residente: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

Contratista: Proyectos Sigma S. A. de C. V

Inicio Vigente: viernes, 15 de junio de 2018

Inicio Real: viernes, 15 de junio de 2018

Fin Vigente: viernes, 12 de octubre de 2018


Fin Real:

Días de Obra: 120 días

Monto Contratado: \$3,338,853.45

Monto Ejercido:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	18/06/2018	1.50%	1.80%	50.0%
2	25/06/2018	5.52%	5.80%	50.0%
3	02/07/2018	11.58%	13.00%	50.0%
4	09/07/2018	15.50%		
5	16/07/2018	22.65%		
6	23/07/2018	29.02%		
7	30/07/2018	37.49%		
8	06/08/2018	44.66%		
9	13/08/2018	51.20%		
10	20/08/2018	58.47%		
11	27/08/2018	66.04%		
12	03/09/2018	71.08%		
13	10/09/2018	79.48%		
14	17/09/2018	82.90%		
15	24/09/2018	93.26%		
16	01/10/2018	96.03%		
17	08/10/2018	98.25%		
18	15/10/2018	100.00%		

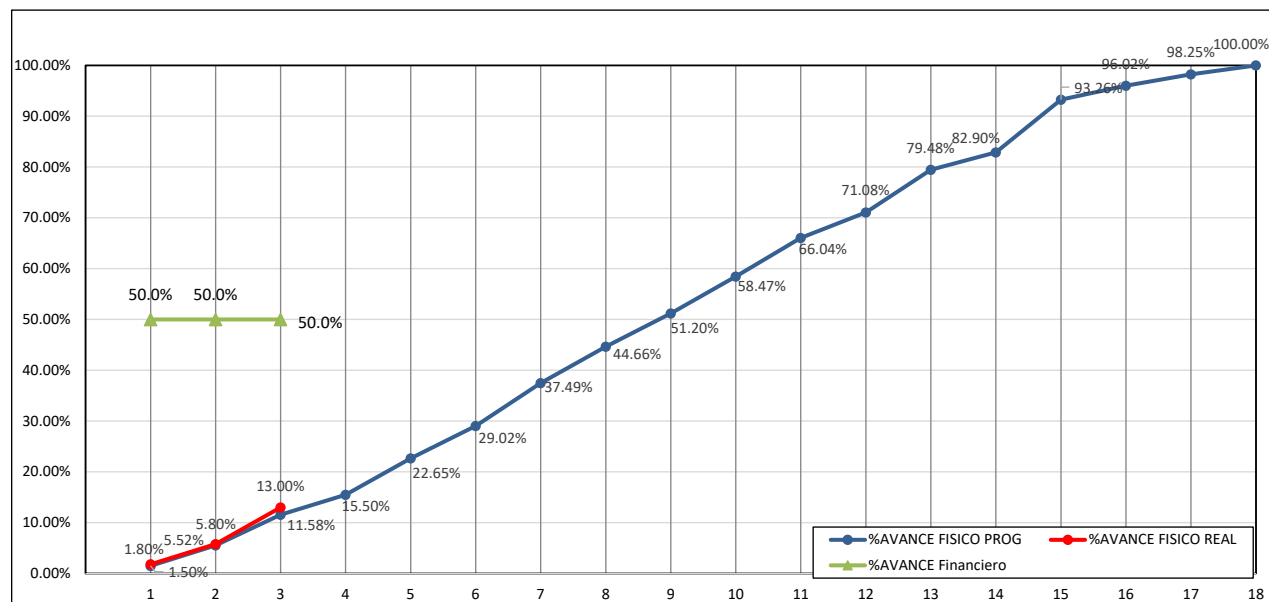

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
