

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 11-999 TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y PERITO RESPONSABLE DE LAS OBRAS: ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Ubicación: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Tipo de inversión: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

Contrato: FISMDF 001/18

Programa: U9). DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES

Contratista: RAMIREZ GUARDADO, ANGEL DE JESUS, I.C.

Subprograma: 01). ESTUDIOS Y PROYECTOS

Inicio Vigente: viernes, 27 de abril de 2018

Días de Obra: 240 días

Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

Inicio Real: viernes, 27 de abril de 2018


Monto Contratado: \$199,810.00

Fin Vigente: sábado, 22 de diciembre de 2018

Monto Ejercido:

Fin Real: sábado, 22 de diciembre de 2018

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/04/2018	5.20%	8.20%	0%
2	07/05/2018	8.20%	10.50%	0%
3	14/05/2018	10.50%	12.30%	0%
4	21/05/2018	12.50%	16.80%	0%
5	28/05/2018	18.30%	20.50%	0%
6	04/06/2018	24.43%	25.00%	0%
7	11/06/2018	27.78%	28.01%	0%
8	18/06/2018	29.25%	30.20%	0%
9	25/06/2018	30.73%	30.80%	0%
10	02/07/2018	33.56%	33.80%	0%
11	09/07/2018	36.96%		
12	16/07/2018	38.40%		
13	23/07/2018	41.25%		
14	30/07/2018	42.73%		
15	06/08/2018	46.06%		
16	13/08/2018	49.93%		
17	20/08/2018	50.40%		
18	27/08/2018	51.58%		
19	03/09/2018	53.35%		
20	10/09/2018	63.66%		
21	17/09/2018	66.37%		
22	24/09/2018	68.68%		
23	01/10/2018	72.57%		
24	08/10/2018	74.58%		
25	15/10/2018	75.99%		
26	22/10/2018	77.71%		
27	29/10/2018	81.60%		
28	05/11/2018	84.91%		
29	12/11/2018	86.62%		
30	19/11/2018	88.33%		
31	26/11/2018	92.22%		
32	03/12/2018	93.25%		
33	10/12/2018	93.53%		
34	17/12/2018	93.58%		
35	24/12/2018	100.00%		

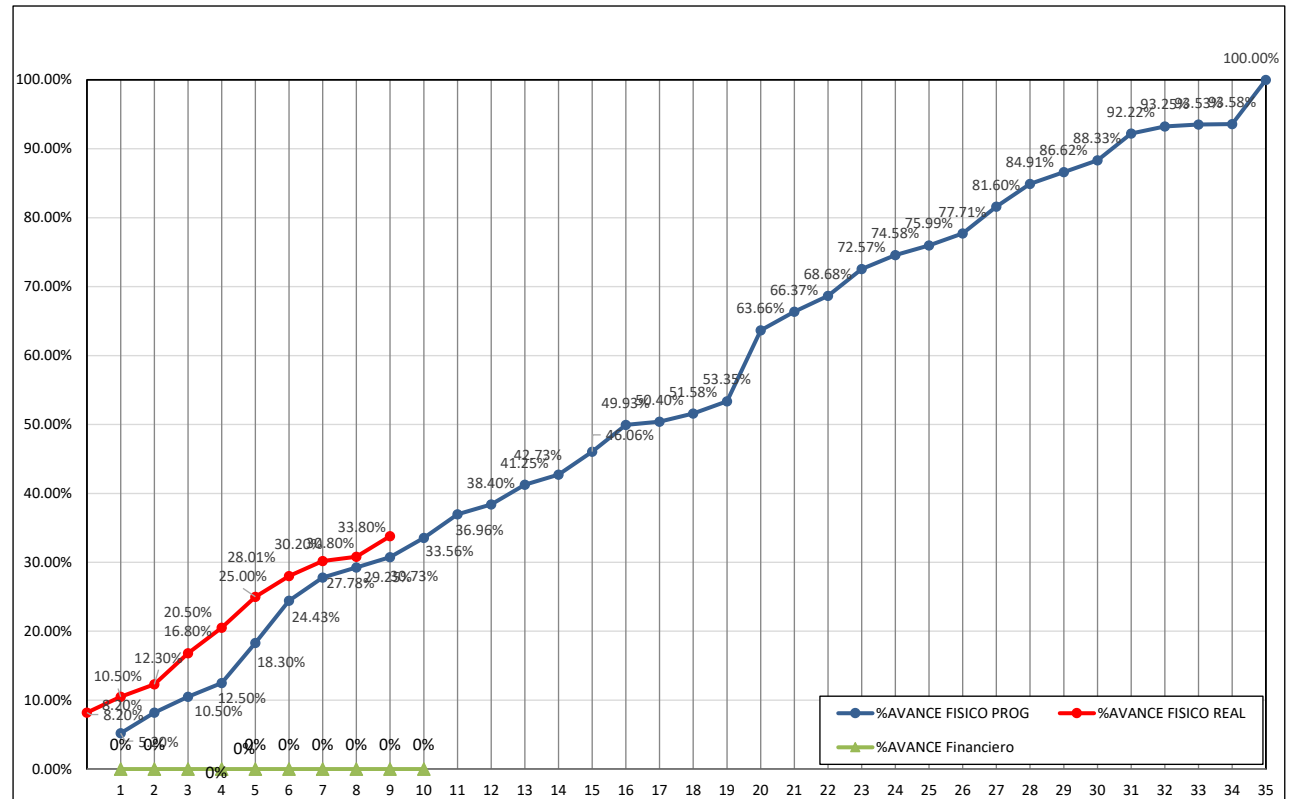

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
