

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FIS MDF 11-002 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 39

**Ubicación:** FRACC. PASEOS DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
**Tipo de inversión:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México


**Contrato:** FIS MDF 002/18

**Programa:** SJ). INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
**Subprograma:** 02 CONSTRUCCION C. SECUNDARIA  
**Residente:** I.C. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

**Contratista:** GCT Bajío Construcciones, S.A. de C.V.,  
**Inicio Vigente:** lunes, 21 de mayo de 2018  
**Inicio Real:** lunes, 21 de mayo de 2018  
**Fin Vigente:** sábado, 18 de agosto de 2018  
**Fin Real:** sábado, 18 de agosto de 2018

**Días de Obra:** 90 días  
**Monto Contratado:** \$1,444,842.45  
**Monto Ejercido:**

| SEMANA | FECHA      | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1      | 28/05/2018 | 0.14%               | 5.00%               | 50.00%             |
| 2      | 04/06/2018 | 3.46%               | 12.00%              | 50.00%             |
| 3      | 11/06/2018 | 6.54%               | 18.00%              | 50.00%             |
| 4      | 18/06/2018 | 10.36%              | 25.00%              | 64.43%             |
| 5      | 25/06/2018 | 22.10%              | 31.00%              |                    |
| 6      | 02/07/2018 | 33.30%              | 33.18%              |                    |
| 7      | 09/07/2018 | 44.55%              |                     |                    |
| 8      | 16/07/2018 | 55.78%              |                     |                    |
| 9      | 23/07/2018 | 68.82%              |                     |                    |
| 10     | 30/07/2018 | 81.60%              |                     |                    |
| 11     | 06/08/2018 | 90.93%              |                     |                    |
| 12     | 13/08/2018 | 97.04%              |                     |                    |
| 13     | 20/08/2018 | 100.00%             |                     |                    |

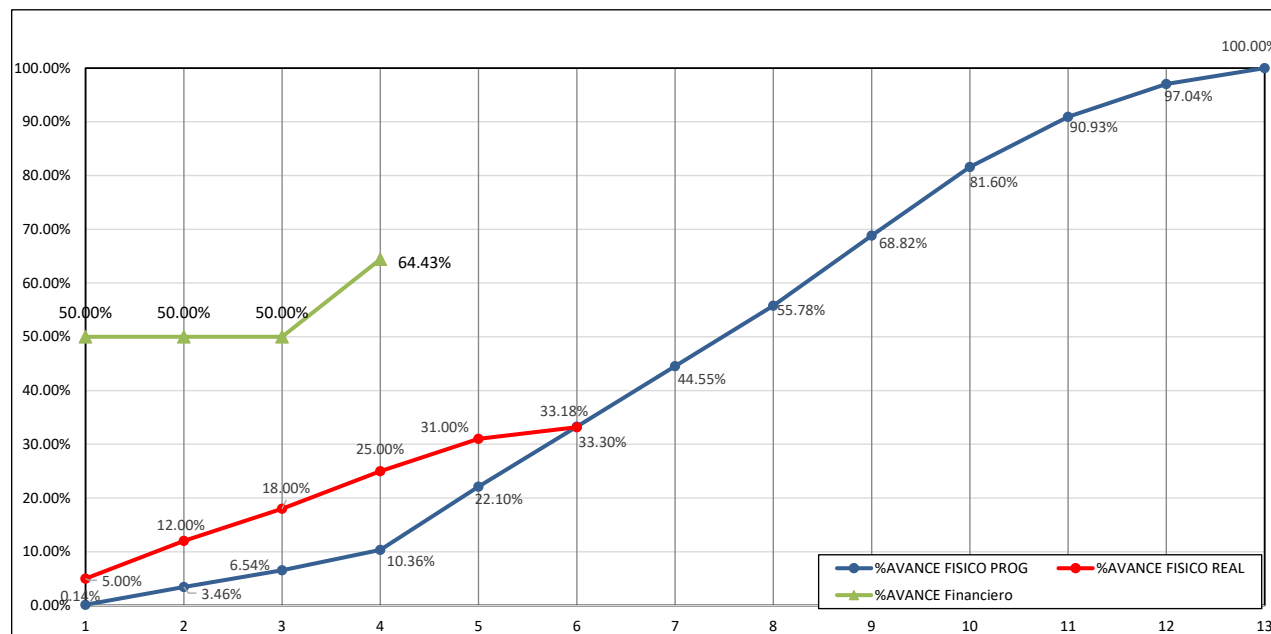

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
