

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FIS MDF 11-003 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO

Ubicación: TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Tipo de inversión: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

Programa: SJ). INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Subprograma: 02 CONSTRUCCION C .SECUNDARIA

Residente: I.C. CARLOS ARMANDO CHÀVEZ GARCÍA

Contrato: FIS MDF 003/18

Contratista: Sacrosa Triturados de Aguascalientes, S.A. de C.V.,

Inicio Vigente: lunes, 21 de mayo de 2018

Inicio Real: lunes, 21 de mayo de 2018

Fin Vigente: sábado, 18 de agosto de 2018


Fin Real: sábado, 18 de agosto de 2018

Días de Obra: 90 DIAS

Monto Contratado: \$792,351.00

Monto Ejercido:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	28/05/2018	0.04%	1.80%	50.00%
2	04/06/2018	0.48%	2.50%	50.00%
3	11/06/2018	2.81%	4.30%	50.00%
4	18/06/2018	6.20%	8.50%	50.00%
5	25/06/2018	9.60%	15.00%	50.00%
6	02/07/2018	25.69%	17.00%	50.00%
7	09/07/2018	41.60%		
8	16/07/2018	57.79%		
9	23/07/2018	74.06%		
10	30/07/2018	90.59%		
11	06/08/2018	94.38%		
12	13/08/2018	97.96%		
13	20/08/2018	100.00%		

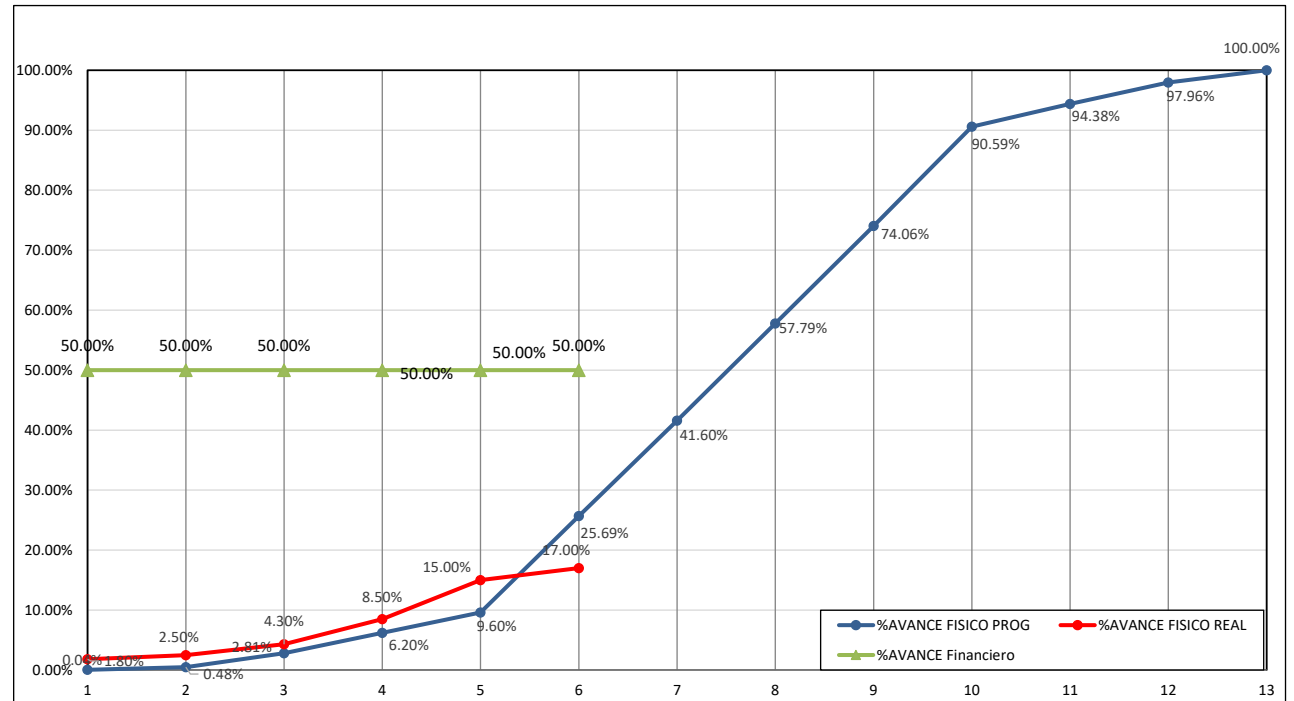

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
