

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FORTAMUN 001/18 REMODELACION Y BLINDAJE DE ARMERIA EN COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Ubicación: CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO,

Tipo de inversión: Fondo para el Fortalecimiento Municipal.

Programa: DA EDIFICIOS PÚBLICOS

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN

Residente: I.C. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Contrato: FORTAMUN 001/18

Contratista: I.C. Cesar Alexis Muñoz Gómez

Inicio Vigente: sábado, 16 de junio de 2018

Inicio Real: sábado, 16 de junio de 2018

Fin Vigente: domingo, 15 de julio de 2018


Fin Real: miércoles, 27 de junio de 2018

Días de Obra: 30 días

Monto Contratado: \$399,000.00

Monto Ejercido: \$398,974.79

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	18/06/2018	0.10%	15.00%	50.0%
2	25/06/2018	3.07%	85.00%	50.0%
3	02/07/2018	37.14%	100.00%	100.0%
4	09/07/2018	71.47%	100.00%	100.0%
5	16/07/2018	100.00%	100.00%	100.0%

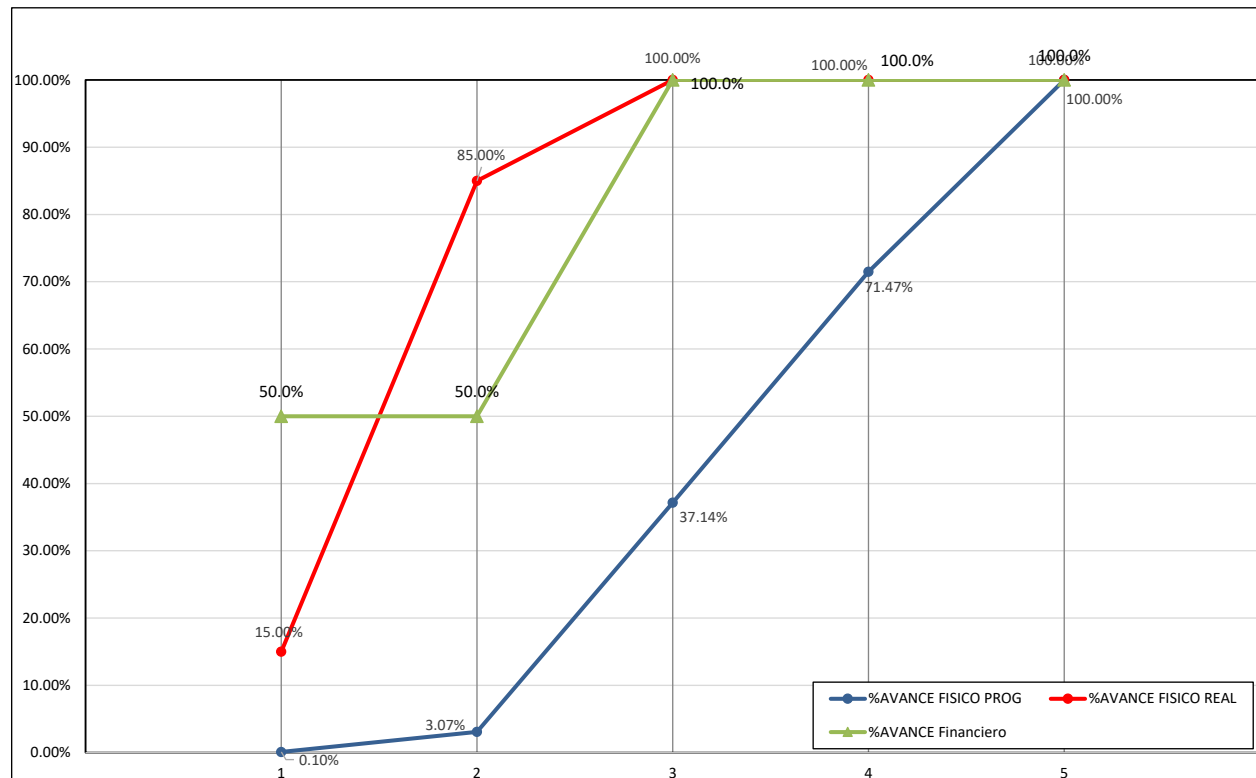

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
