

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ACCESO SUR, PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ubicación: CABECERA MUNICIPAL

Tipo de inversión: Directo Municipal

Programa: SE URBANIZACIÓN

Subprograma: 03 GUARNICIONES Y BANQUETAS B .BANQUETAS

Residente: I.C. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Contrato: DM 001/18

Contratista: CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.

Inicio Vigente: sábado, 5 de mayo de 2018

Inicio Real: sábado, 5 de mayo de 2018

Fin Vigente: domingo, 3 de junio de 2018


Fin Real: miércoles, 23 de mayo de 2018

Días de Obra: 19 días

Monto Contratado: \$207,970.19

Monto Ejercido: \$186,966.55

| SEMANA | FECHA | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 07/05/2018 | 1.23% | 7.20% | 0% |
| 2 | 14/05/2018 | 34.22% | 56.20% | 0% |
| 3 | 21/05/2018 | 73.30% | 98.02% | 0% |
| 4 | 28/05/2018 | 86.56% | 100.00% | 100% |
| 5 | 04/06/2018 | 100.00% | 100.00% | 100% |

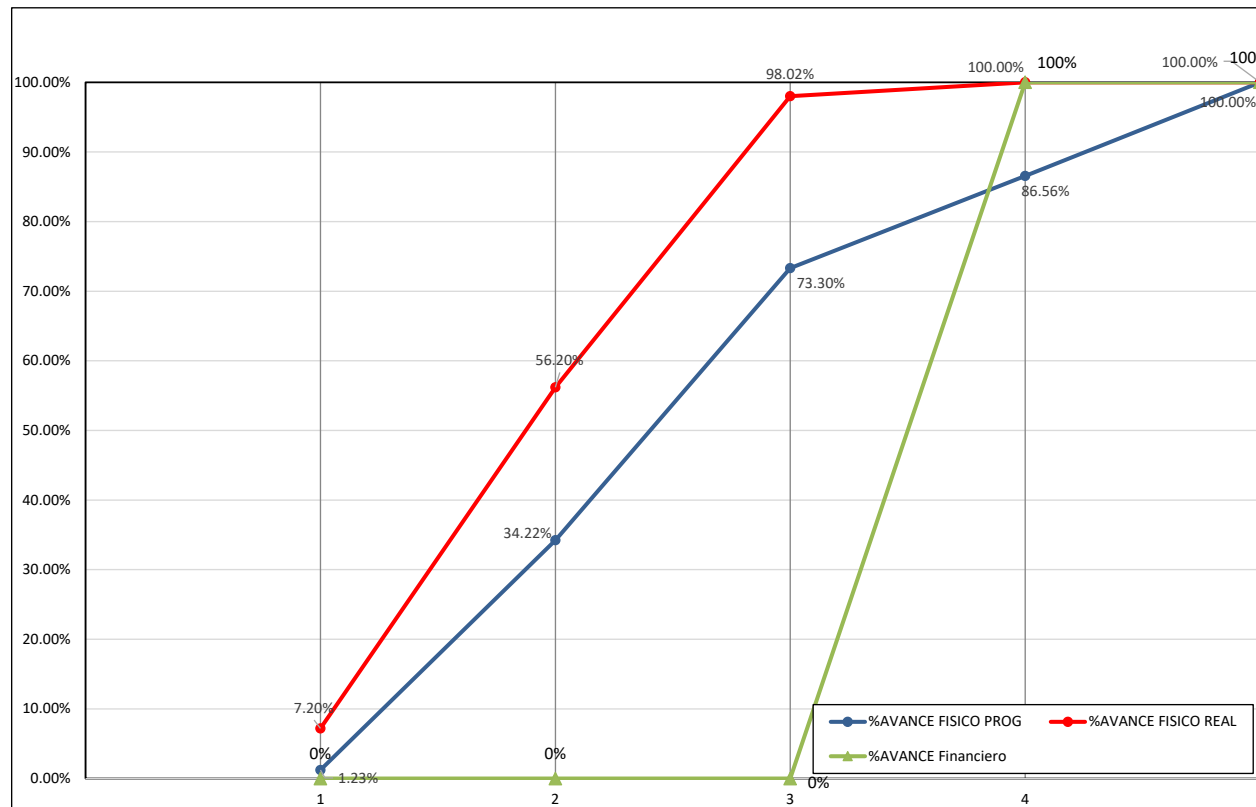

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
