

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MORELOS

Ubicación: EL BARRANCO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.

Tipo de inversión: Directo Municipal

Programa: SD Alcantarillado

Subprograma: 01 Rehabilitación

Residente: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

Contrato: DM 003/18

Contratista: Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V.,

Inicio Vigente: jueves, 27 de septiembre de 2018

Inicio Real: jueves, 27 de septiembre de 2018

Fin Vigente: domingo, 25 de noviembre de 2018


Fin Real:

Días de Obra: 60 días

Monto Contratado: \$396,000.00

Monto Ejercido:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	04/10/2018	2.15%	2.40%	0%
2	11/10/2018	9.38%		
3	18/10/2018	20.76%		
4	25/10/2018	32.13%		
5	01/11/2018	43.51%		
6	08/11/2018	58.56%		
7	15/11/2018	76.77%		
8	22/11/2018	91.65%		
9	29/11/2018	100.00%		

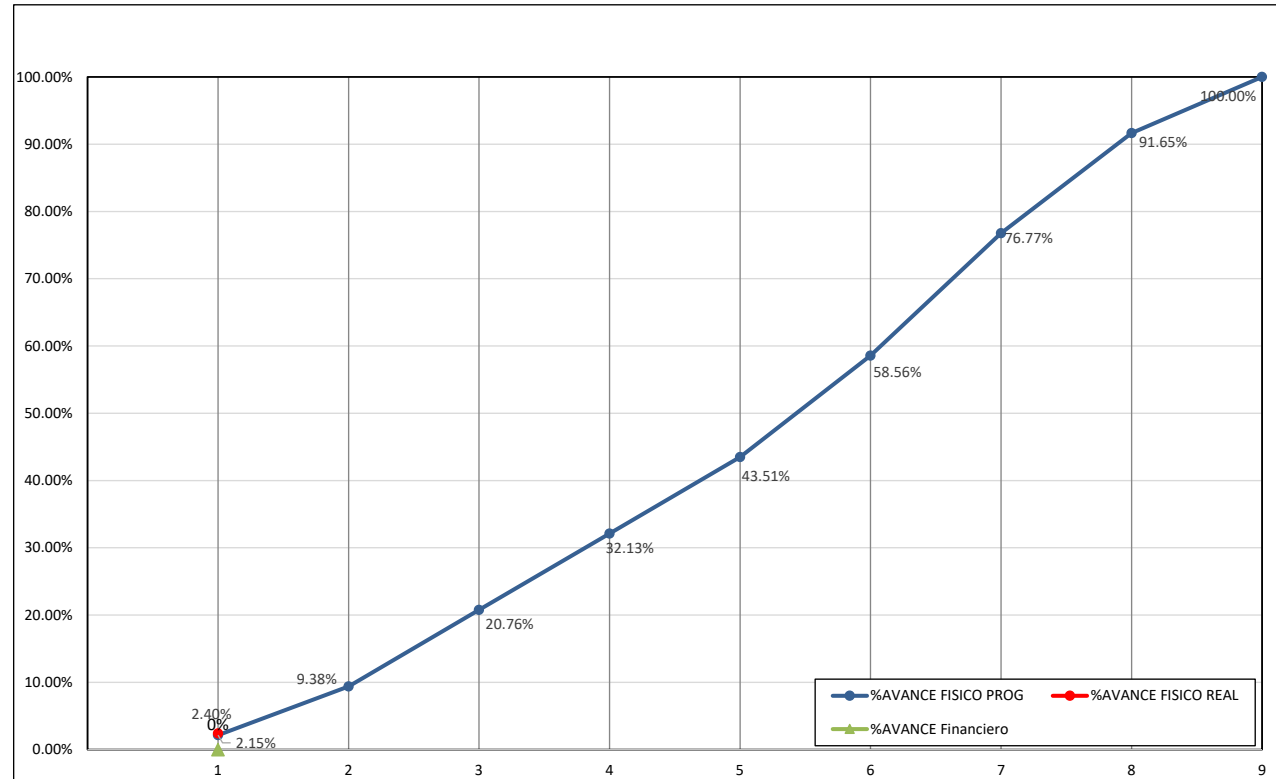

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
