


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** DM 005/18 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA EN EL FRACC. RANCHO SANTA FÉ  
**Ubicación:** URBI VILLAS DEL VERGEL  
**Tipo de inversión:** Directo Municipal  
**Programa:** SJ J INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
**Subprograma:** 02 B) CONSTRUCCION- PRIMARIA  
**Residente:** INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES

**Contrato:** DM 004/18  
**Contratista:** Arrendadora y Constructora JANG, S.A. de C.V.,  
**Inicio Vigente:** sábado, 22 de septiembre de 2018  
**Inicio Real:** sábado, 22 de septiembre de 2018  
**Fin Vigente:** domingo, 21 de octubre de 2018  
**Fin Real:**

**Días de Obra:** 30 días  
**Monto Contratado:** \$464,065.92  
**Monto Ejercido:**

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	25/09/2018	25.48%	28.00%	50%
2	02/10/2018	45.50%	47.50%	50%
3	09/10/2018	65.51%		
4	16/10/2018	91.48%		
4	23/10/2018	100.00%		

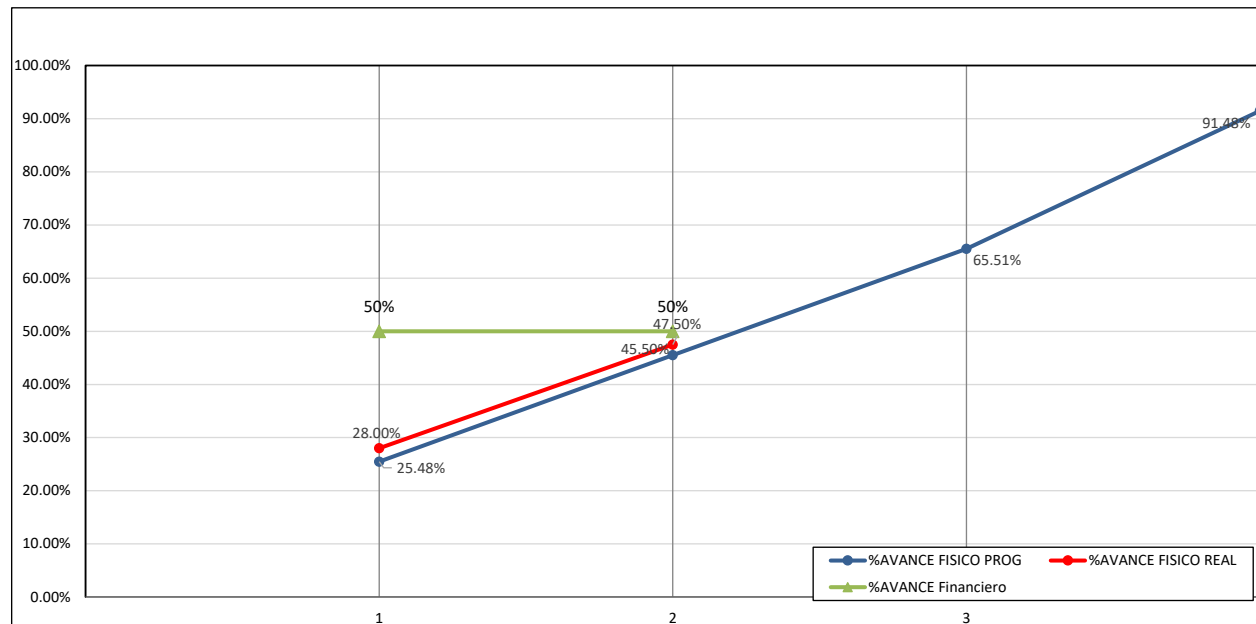

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
