

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: DM 003/18 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO

Ubicación: Cabecera Municipal (Calle Vicente Guerrero, Tramo Calle Priv. 5 de Mayo a Calle José Ma. Morelos Norte)

Tipo de inversión: Directo Municipal

Programa: SD) ALCANTARILLADO

Subprograma: 03) CONSTRUCCIÓN

Residente: INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES

Contrato: DM 005/18

Contratista: Arrendadora y Constructora JANG, S.A. de C.V.,

Inicio Vigente: sábado, 15 de septiembre de 2018

Inicio Real: sábado, 15 de septiembre de 2018

Fin Vigente: domingo, 14 de octubre de 2018


Fin Real:

Días de Obra: 30 días

Monto Contratado: \$322,492.03

Monto Ejercido:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	17/09/2018	1.94%	4.00%	50%
2	24/09/2018	19.58%	23.00%	50%
3	01/10/2018	55.99%	60.00%	50%
4	08/10/2018			
4	15/10/2018			

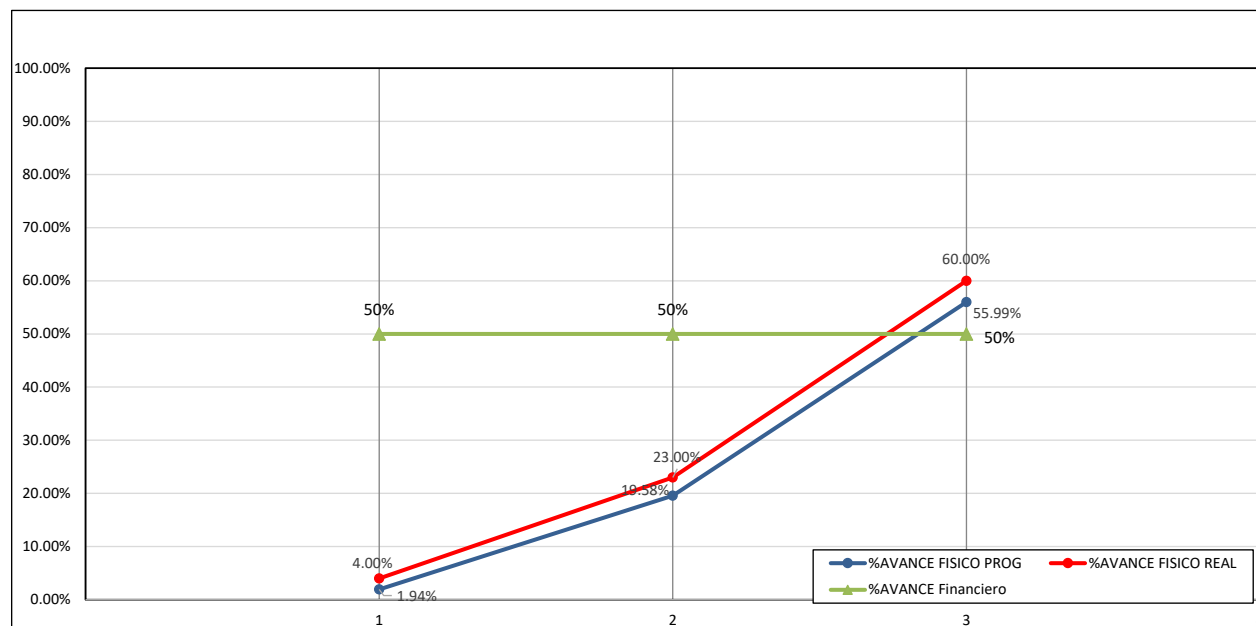

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
