

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y AGROPECUARIO

**Ubicación:** CABECERA MUNICIPAL

**Tipo de inversión:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las

Demarcaciones territoriales del Distrito Federal

**Programa:** DA EDIFICIOS PÚBLICOS

**Subprograma:** 03 CONSTRUCCIÓN

**Residente:** I.C. CARLOS ARMANDO CHÀVEZ GARCÍA

**Contrato:** FIS MDF 004/18

**Contratista:** GCT BAJIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V

**Inicio Vigente:** jueves, 12 de julio de 2018

**Inicio Real:** jueves, 12 de julio de 2018

**Fin Vigente:** jueves, 26 de julio de 2018


**Fin Real:** miércoles, 25 de julio de 2018

**Días de Obra:** 14

**Monto Contratado:** \$188,646.96

**Monto Ejercido:** \$188,646.96

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE FINANCIERO
1	16/07/2018	22.50%	32.00%	0%
2	23/07/2018	82.69%	94.00%	0%
3	30/07/2018	100.00%	100.00%	100%

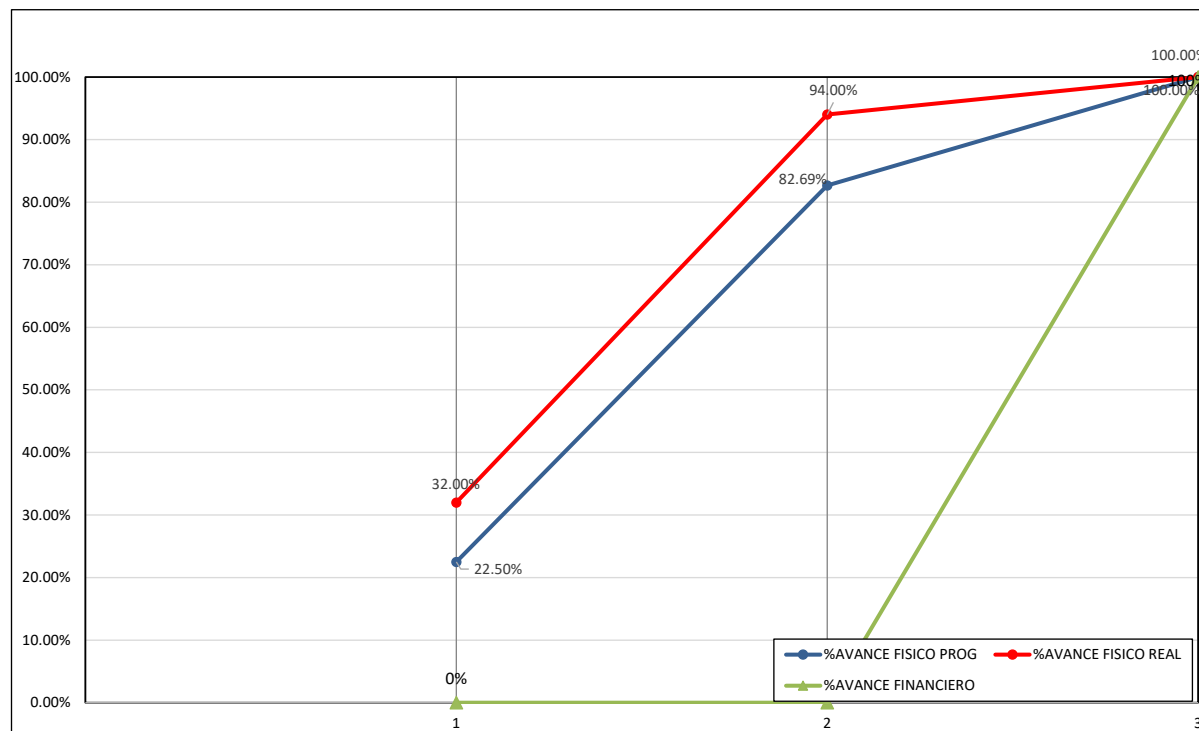

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
