

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE MALLA SOMBRA ESCUELA PRIMARIA "PABLO LATAPI SARRE

Ubicación: FRACC. LA RIBERA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Tipo de inversión: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal
Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Subprograma: 02, B)CONSTRUCCIÓN - PRIMARIA
Residente: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

Contrato: FISMDF 005/18

Contratista: I.C. Cesar Alexis Muñoz Gómez

Inicio Vigente: martes, 2 de octubre de 2018
Inicio Real: martes, 2 de octubre de 2018

Fin Vigente: viernes, 30 de noviembre de 2018


Fin Real:

Días de Obra: 60 días

Monto Contratado: \$578,316.82

Monto Ejercido:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE FINANCIERO
1	09/10/2018	0.55%	1.05%	50%
2	16/10/2018	2.03%		
3	23/10/2018	6.73%		
4	30/10/2018	19.88%		
5	06/11/2018	40.34%		
6	13/11/2018	62.60%		
7	20/11/2018	81.49%		
8	27/11/2018	95.78%		
9	04/12/2018	100.00%		

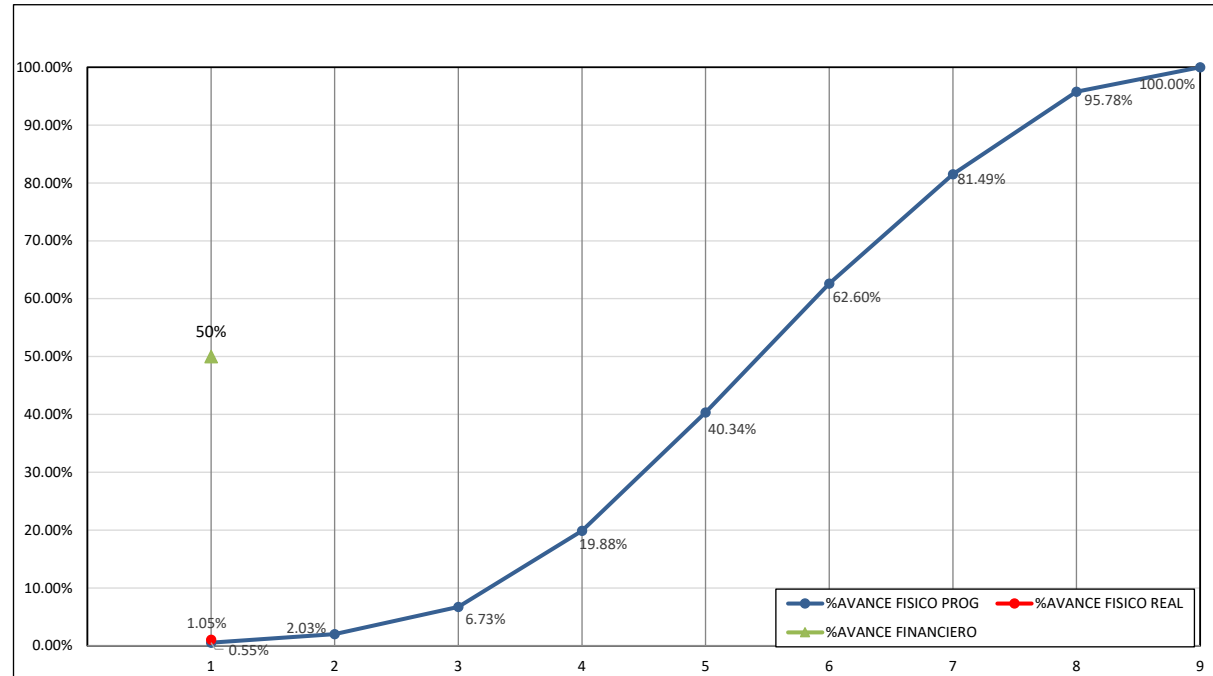

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
