

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FORTAMUN 001/18 REMODELACION Y BLINDAJE DE ARMERIA EN COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA

**Ubicación:** CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO,

**Tipo de inversión:** Fondo para el Fortalecimiento Municipal.

**Programa:** DA EDIFICIOS PÚBLICOS

**Subprograma:** 01 REHABILITACIÓN

**Residente:** I.C. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

**Contrato:** FORTAMUN 001/18

**Contratista:** I.C. Cesar Alexis Muñoz Gómez

**Inicio Vigente:** sábado, 16 de junio de 2018

**Inicio Real:** sábado, 16 de junio de 2018

**Fin Vigente:** domingo, 15 de julio de 2018


**Fin Real:** miércoles, 27 de junio de 2018

**Días de Obra:** 30 días

**Monto Contratado:** \$399,000.00

**Monto Ejercido:** \$398,974.79

| SEMANA | FECHA      | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1      | 18/06/2018 | 0.10%               | 15.00%              | 50.0%              |
| 2      | 25/06/2018 | 3.07%               | 85.00%              | 50.0%              |
| 3      | 02/07/2018 | 37.14%              | 100.00%             | 100.0%             |
| 4      | 09/07/2018 | 71.47%              | 100.00%             | 100.0%             |
| 5      | 16/07/2018 | 100.00%             | 100.00%             | 100.0%             |

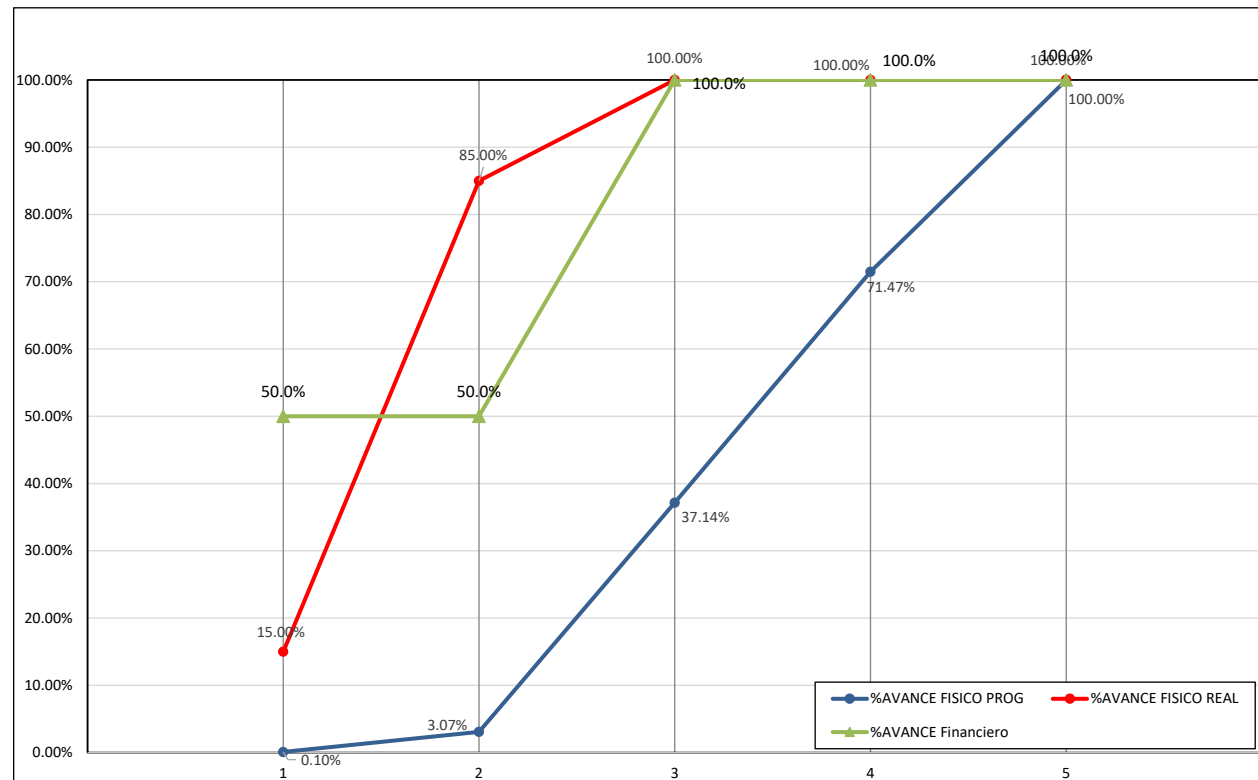

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
