

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: Vo. Bo.- 0077/18 Rehabilitación de Velaria, Jardín Miguel Ángel Barberena

Ubicación: Centro, San Francisco de los Romo, Ags.

Tipo de inversión: (Ramo 23, PRORE 2018)

Programa: SE Urbanización

Subprograma: 04 Construcción de Plaza Cívica y Jardines

Residente: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

Contrato: PRORE 001/18

Contratista: Conestructura, S.A. de C.V.,

Inicio Vigente: jueves, 16 de agosto de 2018

Inicio Real: jueves, 16 de agosto de 2018

Fin Vigente: martes, 13 de noviembre de 2018


Fin Real:

Días de Obra: 90 días

Monto Contratado: \$2,315,594.42

Monto Ejercido:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	16/08/2018	1.08%	3.00%	50.0%
2	23/08/2018	3.81%	5.20%	50.0%
3	30/08/2018	5.24%	8.50%	50.0%
4	06/09/2018	6.75%	11.80%	50.0%
5	13/09/2018	9.85%	15.15%	62.7%
6	20/09/2018	12.52%	25.00%	62.7%
7	27/09/2018	17.78%	38.00%	62.7%
8	04/10/2018	31.76%	50.00%	62.7%
9	11/10/2018	45.75%		
10	18/10/2018	59.73%		
11	25/10/2018	74.23%		
12	01/11/2018	90.11%		
13	08/11/2018	99.46%		
14	15/11/2018	100.00%		

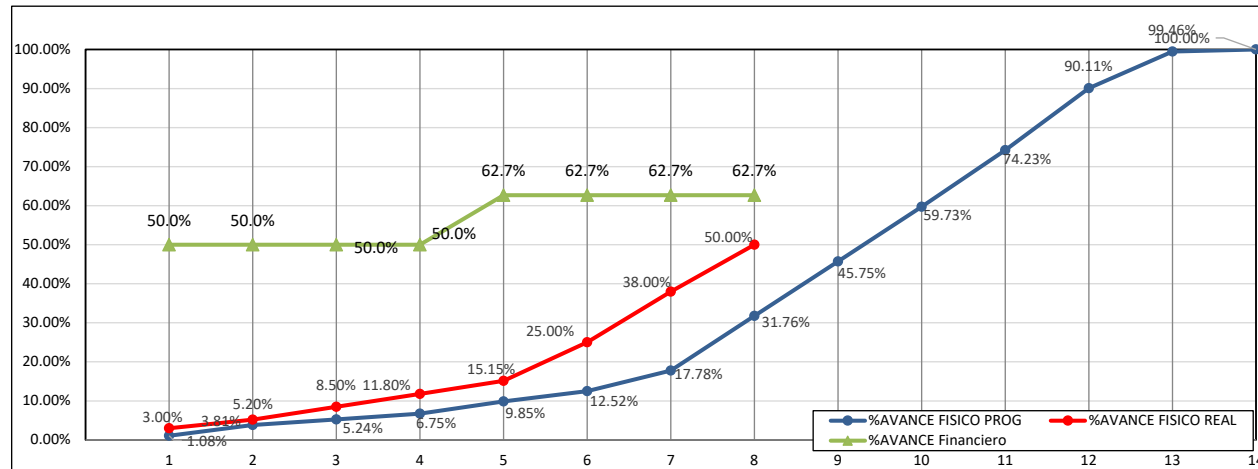

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
