


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: 010111ME001 Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario 28 de Abril
Ubicación: Col. 28 de Abril, San Francisco de los Romo, Ags.
Tipo de inversión: Programa de Infraestructura de la Vertiente para el Habitat.

Contrato: HABITAT 001/18
Contratista: I.C. Tereso Javier de la Peña Castillo
Inicio Vigente: viernes, 17 de agosto de 2018
Inicio Real: viernes, 17 de agosto de 2018
Fin Vigente: jueves, 6 de diciembre de 2018
Fin Real: jueves, 6 de diciembre de 2018

Días de Obra: 112 días
Monto Contratado: \$7,488,519.29
Monto Ejercido: \$7,488,519.29

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	24/08/2018	0.36%	0.50%	50.0%
2	31/08/2018	1.52%	1.80%	50.0%
3	07/09/2018	9.30%	9.80%	50.0%
4	14/09/2018	13.95%	14.20%	50.0%
5	21/09/2018	14.37%	14.80%	50.0%
6	28/09/2018	19.58%	20.02%	53.6%
7	05/10/2018	31.80%	32.10%	53.6%
8	12/10/2018	37.80%	38.00%	53.6%
9	19/10/2018	44.72%	45.00%	59.0%
10	26/10/2018	55.51%	55.68%	63.6%
11	02/11/2018	66.31%	67.00%	63.6%
12	09/11/2018	68.12%	69.50%	69.0%
13	16/11/2018	70.35%	71.40%	69.0%
14	23/11/2018	78.72%	79.00%	76.4%
15	30/11/2018	86.52%	87.00%	76.4%
16	07/12/2018	100.00%	100.00%	76.4%
17	14/12/2018	100.00%	100.00%	78.6%
18	21/12/2018	100.00%	100.00%	100.0%

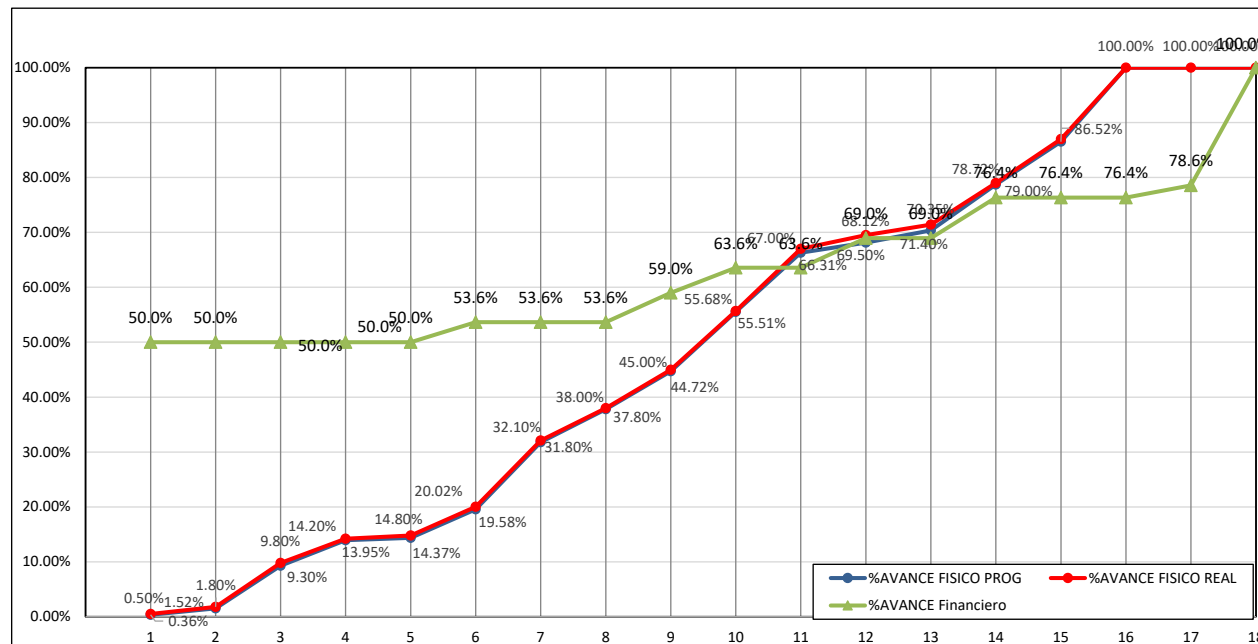

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
