

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FORTASEG 001/18 COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, GARITA Y ESTACIONAMIENTO COMANDANCIA)

Ubicación: CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO,
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de
Seguridad Pública (FORTASEG 2018)

Contrato: FORTASEG 001/18

Tipo de inversión:

Programa: DA EDIFICIOS PÚBLICOS

Contratista: Proyectos Sigma S. A. de C. V

Días de Obra: 120 días

Subprograma: 03 Construcción

Inicio Vigente: viernes, 15 de junio de 2018

Monto Contratado: \$3,338,853.45

Residente: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES


Inicio Real: viernes, 15 de junio de 2018

Monto Ejercido: \$3,338,853.45

Fin Vigente: viernes, 12 de octubre de 2018

Fin Real: viernes, 12 de octubre de 2018

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	18/06/2018	1.50%	1.80%	50.0%
2	25/06/2018	5.52%	5.80%	50.0%
3	02/07/2018	11.58%	13.00%	50.0%
4	09/07/2018	15.50%	18.00%	50.0%
5	16/07/2018	22.65%	32.00%	50.0%
6	23/07/2018	29.02%	45.00%	61.0%
7	30/07/2018	37.49%	54.70%	61.0%
8	06/08/2018	44.66%	62.00%	76.5%
9	13/08/2018	51.20%	68.00%	76.5%
10	20/08/2018	58.47%	77.00%	86.6%
11	27/08/2018	66.04%	83.00%	86.6%
12	03/09/2018	71.08%	88.00%	86.6%
13	10/09/2018	79.48%	90.00%	91.5%
14	17/09/2018	82.90%	92.00%	91.5%
15	24/09/2018	93.26%	93.50%	91.5%
16	01/10/2018	96.02%	95.00%	91.5%
17	08/10/2018	98.25%	98.00%	91.5%
18	15/10/2018	100.00%	100.00%	91.5%
19	22/10/2018	100.00%	100.00%	95.8%
20	29/10/2018	100.00%	100.00%	95.8%
21	05/11/2018	100.00%	100.00%	95.8%
22	12/11/2018	100.00%	100.00%	95.8%
23	19/11/2018	100.00%	100.00%	95.8%
24	26/11/2018	100.00%	100.00%	95.8%
25	03/12/2018	100.00%	100.00%	100.0%

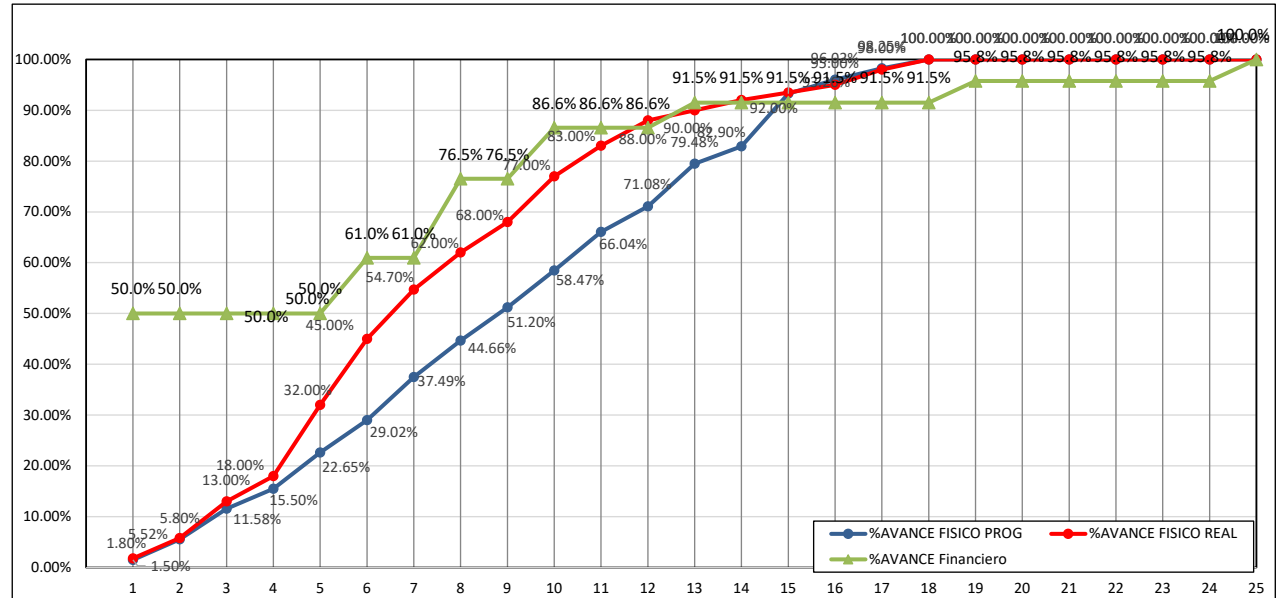

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
