

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: Vo. Bo.- 0077/18 Rehabilitación de Velaria, Jardín Miguel Ángel Barberena

Ubicación: Centro, San Francisco de los Romo, Ags.

Tipo de inversión: (Ramo 23, PRORE 2018)

Programa: SE Urbanización

Subprograma: 04 Construcción de Plaza Cívica y Jardines

Residente: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

Contrato: PRORE 001/18
Contratista: Conestructura, S.A. de C.V.,

Inicio Vigente: jueves, 16 de agosto de 2018

Inicio Real: jueves, 16 de agosto de 2018

Fin Vigente: martes, 13 de noviembre de 2018


Fin Real: martes, 13 de noviembre de 2018

Días de Obra: 90 días

Monto Contratado: \$2,315,594.42

Monto Ejercido: \$2,255,453.04

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	16/08/2018	1.08%	3.00%	50.0%
2	23/08/2018	3.81%	5.20%	50.0%
3	30/08/2018	5.24%	8.50%	50.0%
4	06/09/2018	6.75%	11.80%	50.0%
5	13/09/2018	9.85%	19.00%	62.7%
6	20/09/2018	12.52%	25.00%	62.7%
7	27/09/2018	17.78%	52.00%	62.7%
8	04/10/2018	31.76%	65.00%	62.7%
9	11/10/2018	45.75%	92.00%	69.8%
10	18/10/2018	59.73%	95.00%	69.8%
11	25/10/2018	74.23%	97.50%	69.8%
12	01/11/2018	90.11%	99.50%	69.8%
13	08/11/2018	99.46%	100.00%	69.8%
14	15/11/2018	100.00%	100.00%	81.7%
15	22/11/2018	100.00%	100.00%	81.7%
16	29/11/2018	100.00%	100.00%	81.7%
17	06/12/2018	100.00%	100.00%	81.7%
18	13/12/2018	100.00%	100.00%	81.7%
19	20/12/2018	100.00%	100.00%	100.0%

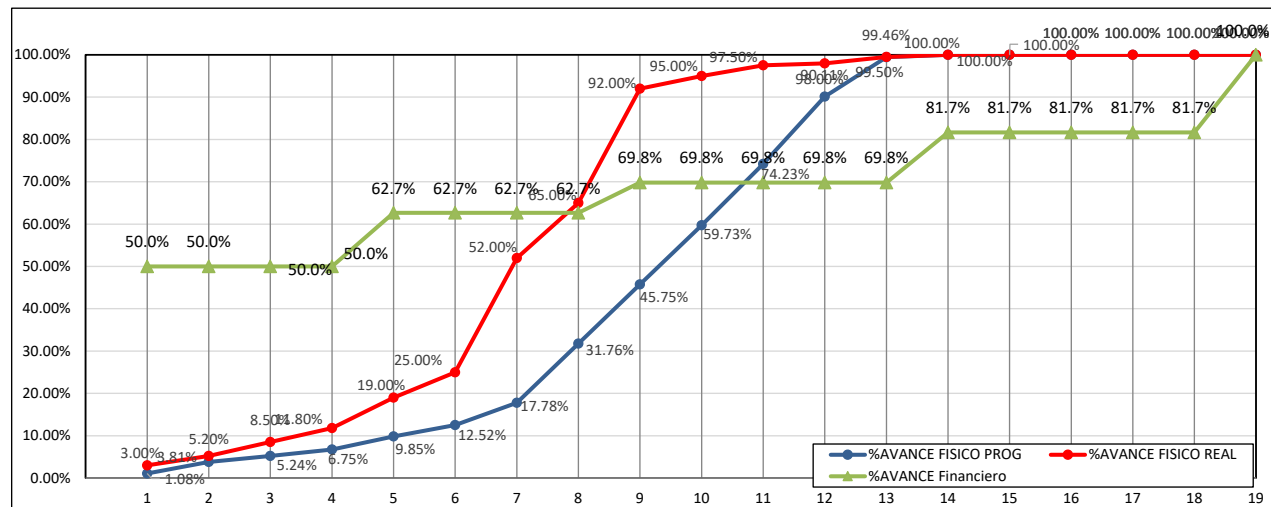

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
