

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MORELOS

Ubicación: EL BARRANCO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.

Tipo de inversión: Directo Municipal

Programa: SD Alcantarillado

Subprograma: 01 Rehabilitación

Residente: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

Contrato: DM 003/18

Contratista: Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V.,

Inicio Vigente: jueves, 27 de septiembre de 2018

Inicio Real: jueves, 27 de septiembre de 2018

Fin Vigente: domingo, 25 de noviembre de 2018


Fin Real: domingo, 25 de noviembre de 2018

Días de Obra: 60 días

Monto Contratado: \$396,000.00

Monto Ejercido: \$394,697.76

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	04/10/2018	2.15%	2.40%	50%
2	11/10/2018	9.38%	12.00%	50%
3	18/10/2018	27.61%	28.00%	50%
4	25/10/2018	44.47%	37.00%	50%
5	01/11/2018	52.13%	60.00%	50%
6	08/11/2018	62.34%	78.00%	50%
7	15/11/2018	79.41%	82.00%	50%
8	22/11/2018	89.70%	94.00%	50%
9	29/11/2018	100.00%	100.00%	81%
10	06/12/2018	100.00%	100.00%	81%
11	13/12/2018	100.00%	100.00%	100%

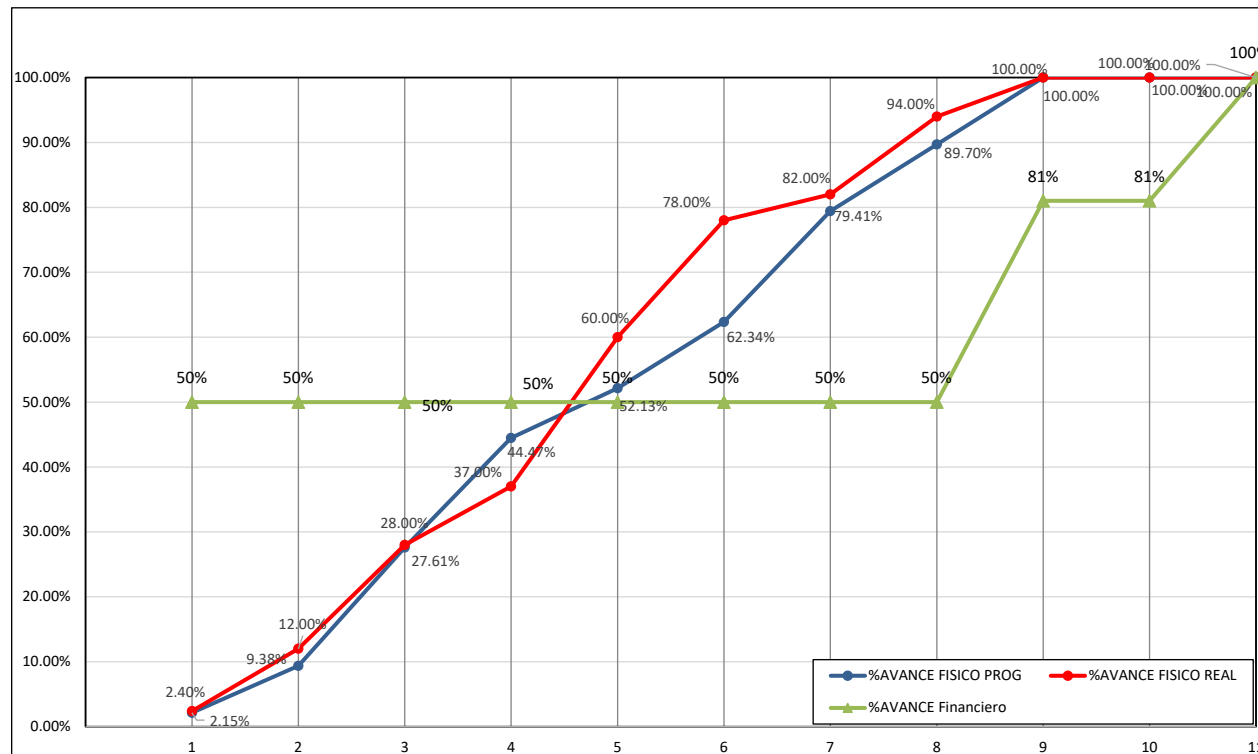

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
