


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: DM 005/18 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA EN EL FRACC. RANCHO SANTA FÉ
Ubicación: URBI VILLAS DEL VERGEL
Tipo de inversión: Directo Municipal
Programa: SJ J INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Subprograma: 02 B) CONSTRUCCION- PRIMARIA
Residente: INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES

Contrato: DM 004/18
Contratista: Arrendadora y Constructora JANG, S.A. de C.V.,
Inicio Vigente: sábado, 22 de septiembre de 2018
Inicio Real: sábado, 22 de septiembre de 2018
Fin Vigente: domingo, 21 de octubre de 2018
Fin Real: domingo, 21 de octubre de 2018

Días de Obra: 30 días
Monto Contratado: \$464,065.92
Monto Ejercido: \$464,065.92

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	25/09/2018	25.48%	28.00%	50%
2	02/10/2018	45.50%	47.50%	50%
3	09/10/2018	65.51%	68.00%	50%
4	16/10/2018	91.48%	93.00%	50%
5	23/10/2018	100.00%	100.00%	50%
6	30/10/2018	100.00%	100.00%	100%

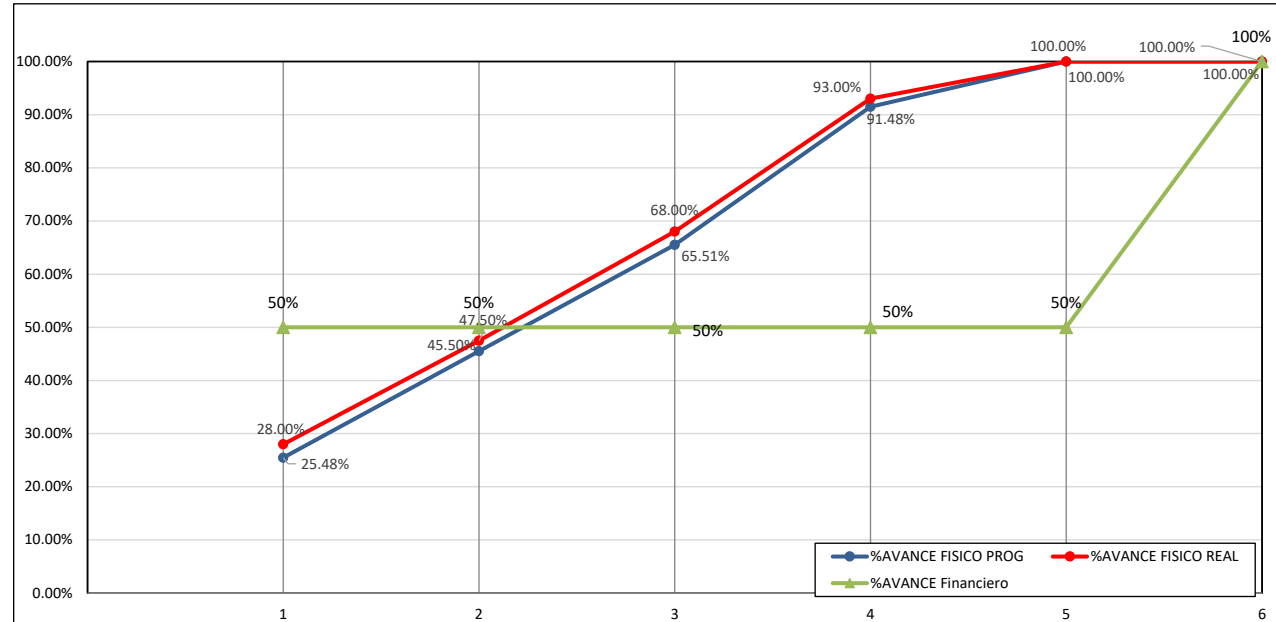

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
