

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FIS MDF 11-002 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 39

Ubicación: FRACC. PASEOS DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Tipo de inversión: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México


Contrato: FIS MDF 002/18

Programa: SJ. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Subprograma: 02 CONSTRUCCION C. SECUNDARIA
Residente: I.C. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Contratista: GCT Bajío Construcciones, S.A. de C.V.,
Inicio Vigente: lunes, 21 de mayo de 2018
Inicio Real: lunes, 21 de mayo de 2018
Fin Vigente: sábado, 18 de agosto de 2018
Fin Real: sábado, 18 de agosto de 2018

Días de Obra: 90 días
Monto Contratado: \$1,460,037.00
Monto Ejercido: \$1,460,037.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	28/05/2018	2.03%	5.00%	49.47%
2	04/06/2018	5.52%	12.00%	49.47%
3	11/06/2018	8.32%	18.00%	49.47%
4	18/06/2018	20.56%	25.00%	64.43%
5	25/06/2018	31.27%	33.00%	64.43%
6	02/07/2018	41.98%	44.20%	64.43%
7	09/07/2018	52.69%	55.18%	64.43%
8	16/07/2018	63.40%	65.40%	68.51%
9	23/07/2018	79.58%	80.15%	68.51%
10	30/07/2018	88.20%	90.31%	68.51%
11	06/08/2018	96.72%	97.33%	71.3%
12	13/08/2018	99.57%	99.80%	81.81%
13	20/08/2018	100.00%	100.00%	99.6%
14	27/08/2018	100.00%	100.00%	99.6%
15	03/09/2018	100.00%	100.00%	99.6%
16	10/09/2018	100.00%	100.00%	99.6%
17	17/09/2018	100.00%	100.00%	100%

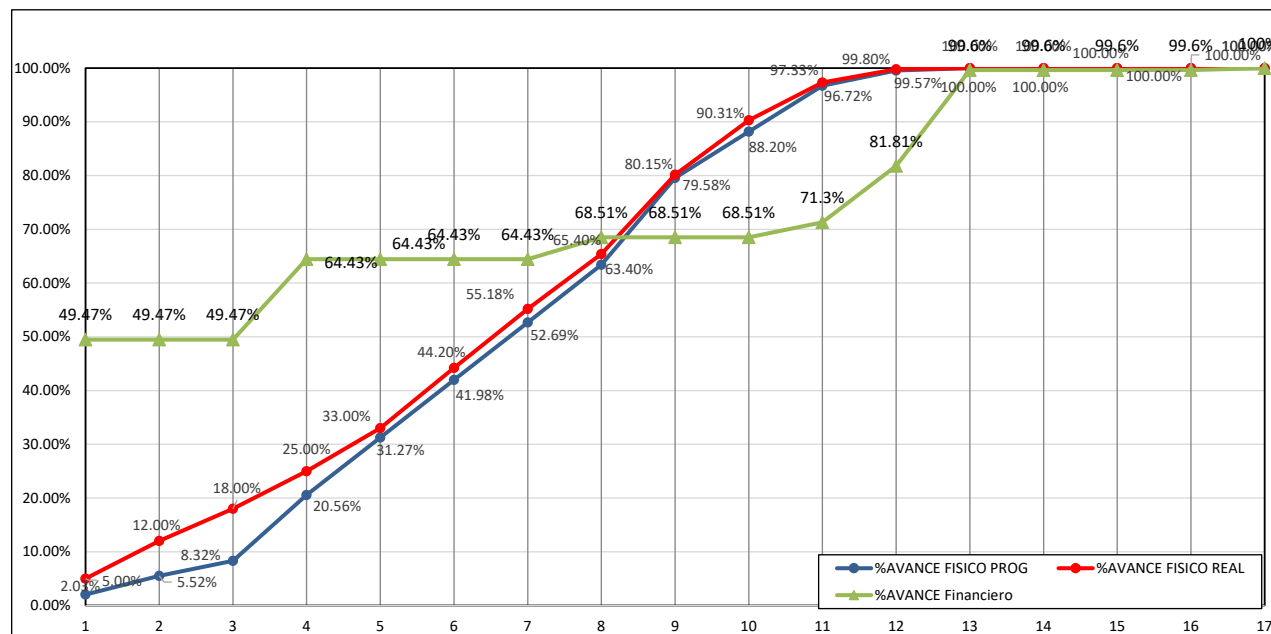

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
