

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 11-003 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO

Ubicación: TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Tipo de inversión: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

Programa: SJ). INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Subprograma: 02 CONSTRUCCION C .SECUNDARIA

Residente: I.C. CARLOS ARMANDO CHÀVEZ GARCÌA

Contrato: FISMDF 003/18

Contratista: Sacrosa Triturados de Aguascalientes, S.A. de C.V.,

Inicio Vigente: lunes, 21 de mayo de 2018

Inicio Real: lunes, 21 de mayo de 2018

Fin Vigente: sábado, 18 de agosto de 2018


Fin Real: sábado, 18 de agosto de 2018

Días de Obra: 90 DIAS

Monto Contratado: \$792,351.00

Monto Ejercido: \$792,351.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	28/05/2018	0.44%	1.80%	48.62%
2	04/06/2018	1.69%	2.50%	48.62%
3	11/06/2018	5.09%	4.30%	48.62%
4	18/06/2018	8.49%	8.50%	48.62%
5	25/06/2018	22.30%	25.00%	48.62%
6	02/07/2018	37.99%	47.00%	48.62%
7	09/07/2018	55.26%	68.00%	55.73%
8	16/07/2018	71.02%	75.00%	69.71%
9	23/07/2018	87.55%	90.00%	83.27%
10	30/07/2018	93.66%	95.00%	83.27%
11	06/08/2018	97.45%	98.00%	87.69%
12	13/08/2018	98.98%	99.50%	95.47%
13	20/08/2018	100.00%	100.00%	97.20%
14	27/08/2018	100.00%	100.00%	97.20%
15	03/09/2018	100.00%	100.00%	97.20%
16	10/09/2018	100.00%	100.00%	100.00%

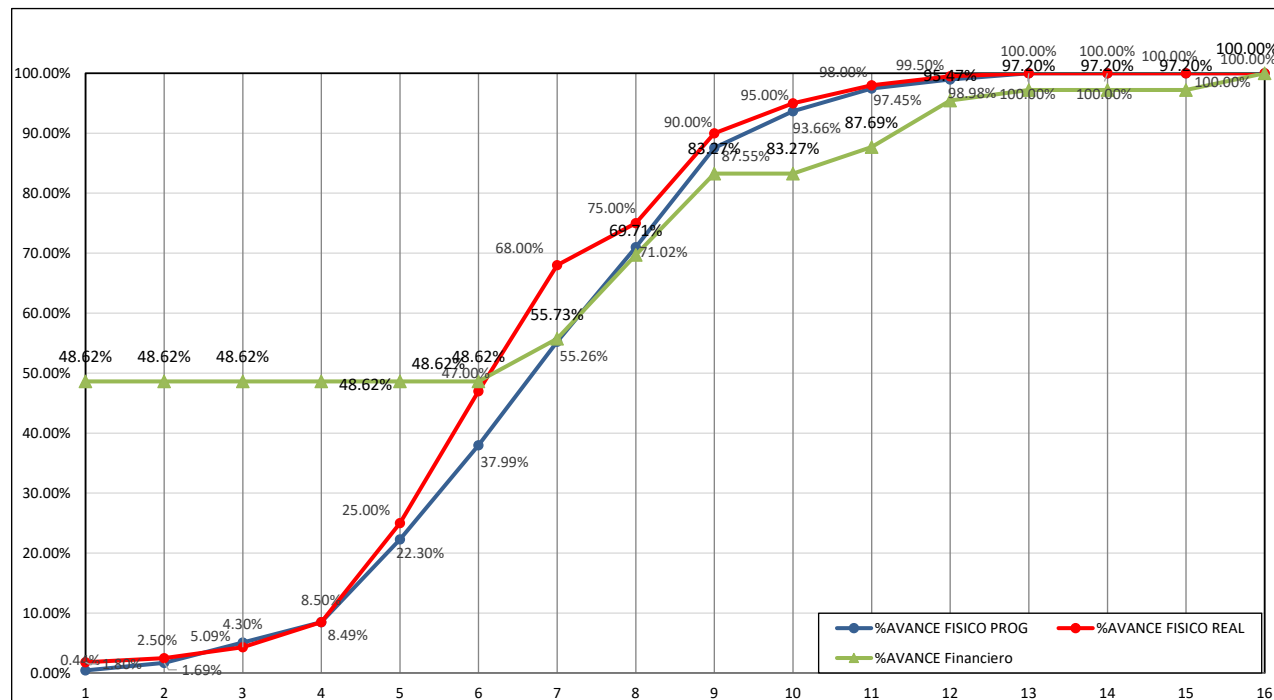

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
