

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: 11-001 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE MALLA SOMBRA ESCUELA PRIMARIA PABLO LATAPI SARRE

Ubicación: FRACC. LA RIBERA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Tipo de inversión: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

Programa: SJ). INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Subprograma: 02 CONSTRUCCION B .PRIMARIA

Residente: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

Contrato: FIS MDF 005/18

Contratista: CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ, I.C.

Inicio Vigente: martes, 2 de octubre de 2018

Inicio Real: martes, 2 de octubre de 2018

Fin Vigente: viernes, 30 de noviembre de 2018


Fin Real: viernes, 30 de noviembre de 2018

Días de Obra: 60 días

Monto Contratado: \$590,886.02

Monto Ejercido: \$590,886.02

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	08/10/2018	0.99%	2.00%	50.00%
2	15/10/2018	3.96%	5.00%	50.00%
3	22/10/2018	8.55%	9.50%	50.00%
4	29/10/2018	26.97%	30.00%	50.00%
5	05/11/2018	48.45%	49.00%	50.00%
6	12/11/2018	69.90%	70.00%	50.00%
7	19/11/2018	88.20%	91.00%	50.00%
8	26/11/2018	97.00%	98.00%	58.46%
9	03/12/2018	100.00%	100.00%	90.56%
10	10/12/2018	100.00%	100.00%	97.87%
11	17/12/2018	100.00%	100.00%	100.0%

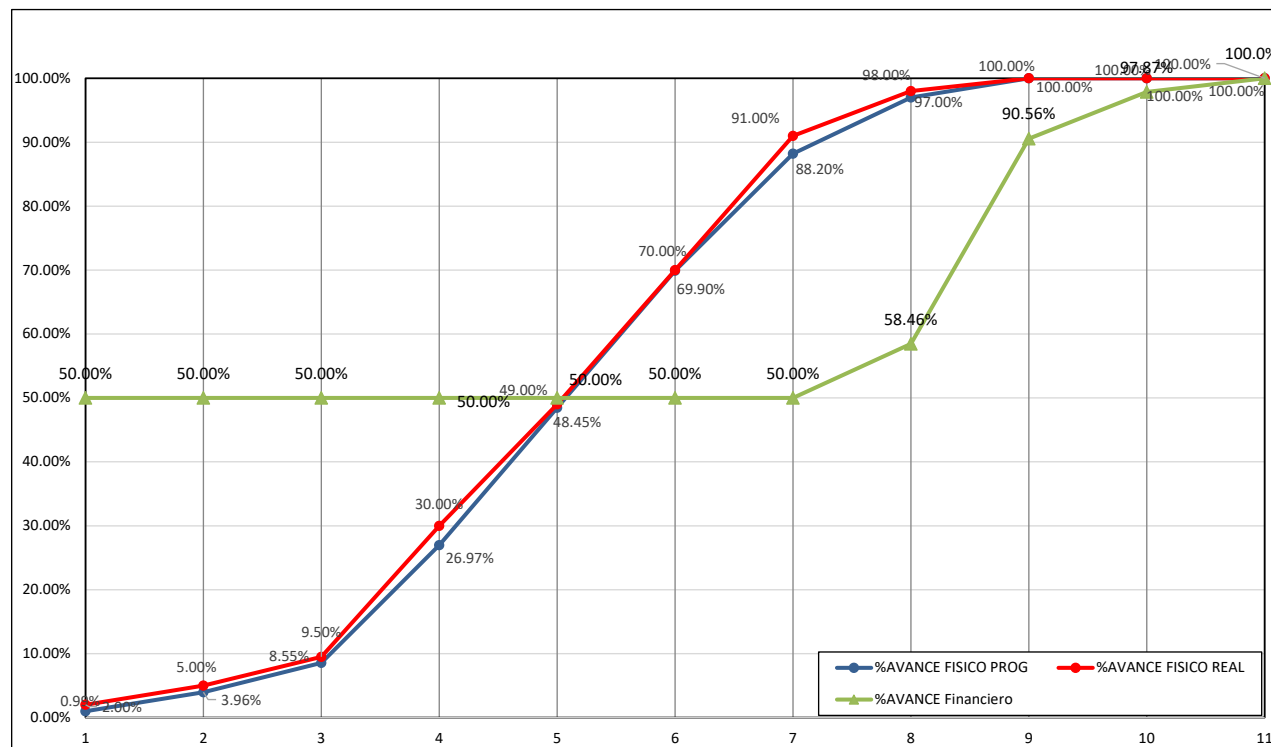

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
