

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 11-004 CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

ZONA NORTE DEL MUNICIPIO
(AMAPOLAS DEL RIO, BORROTÉS, TEPETATE, OJO DE AGUA DEL MEZQUITE,

Ubicación: RANCHO NUEVO, FRACC.CERRADA SAN FRANCISCO, FRACC.HIDALGO, FRACC.LOS LIRIOS, FRACC.REVOLUCION, FRACC. SAN JOSE DEL BARRANCO, FRACC. SANTA BARBARA, ZONA CENTRO.)

Tipo de inversión: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Programa: SH VIVIENDA DIGNA

Subprograma: 02 AMPLIACION DE VIVIENDA

Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

Contrato: FISMDF 006/18

Contratista: BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Inicio Vigente: miércoles, 7 de noviembre de 2018

Días de Obra: 30 días

Inicio Real: miércoles, 7 de noviembre de 2018


Monto Contratado: \$2,437,741.84

Fin Vigente: jueves, 6 de diciembre de 2018

Monto Ejercido: \$2,437,741.84

Fin Real: jueves, 6 de diciembre de 2018

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE FINANCIERO
1	12/11/2018	10.70%	12.00%	50%
2	19/11/2018	35.40%	44.80%	50%
3	26/11/2018	66.18%	67.00%	75%
4	03/12/2018	95.40%	98.00%	75%
5	10/12/2018	100.00%	100.00%	75%
6	17/12/2018	100.00%	100.00%	75%
7	24/12/2018	100.00%	100.00%	100%

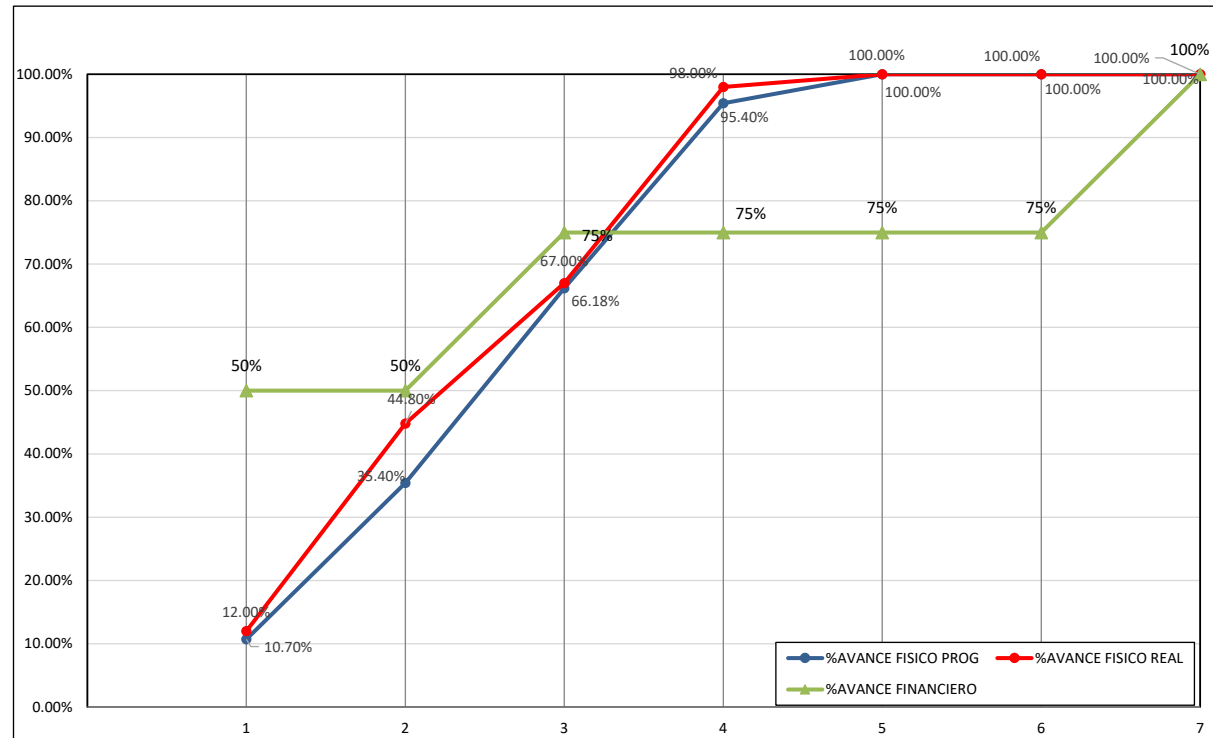

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
