

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 11-005 CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Ubicación: ZONA SUR DEL MUNICIPIO
(COL. 28 DE ABRIL, LA PROVIDENCIA, ESTACION CHICALOTE, LA CONCEPCION, LA GUAYANA, LORETITO, MACARIO J. GOMEZ, LA ESCONDIDA, PUERTECITO DE LA VIRGEN, FRACC. SAN JOSE DE BUENAVISTA, LADRILLERAS).

Tipo de inversión: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Programa: SH VIVIENDA DIGNA

Subprograma: 02 AMPLIACION DE VIVIENDA

Residente: I.C. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Contrato: FISMDF 007/18

Contratista:

A. P. Fradag Construcciones, S.A. de C.V. / Olda Construcciones, S.A. de C.V.,

Inicio Vigente: martes, 13 de noviembre de 2018

Días de Obra: 30 días

Inicio Real: martes, 13 de noviembre de 2018


Monto Contratado: \$2,406,709.31

Fin Vigente: miércoles, 12 de diciembre de 2018

Monto Ejercido: \$2,406,709.31

Fin Real: miércoles, 12 de diciembre de 2018

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE FINANCIERO
1	19/11/2018	10.30%	12.00%	50%
2	26/11/2018	38.35%	42.00%	50%
3	03/12/2018	65.88%	71.00%	50%
4	10/12/2018	92.20%	95.00%	75%
5	17/12/2018	100.00%	100.00%	75%
6	24/12/2018	100.00%	100.00%	100%

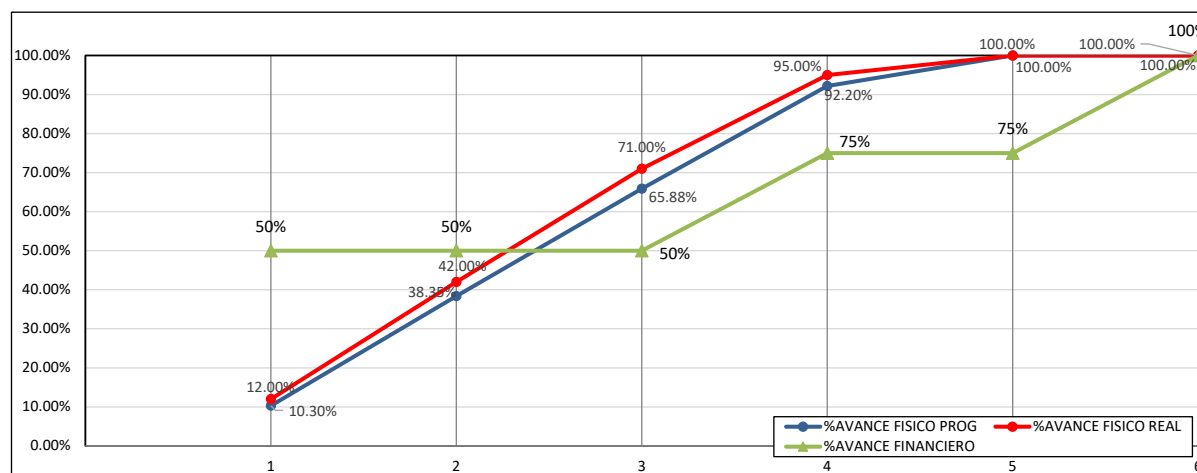

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
