


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

<b>Obra:</b>	Servicio de Diseño, Arquitectura, de Ingeniería y Actividades Relacionadas (Trámite de Licencia de Construcción y Perito Responsable de la Obra: Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario 28 de abril).				
<b>Ubicación:</b>	CABECERA MUNICIPAL	<b>Contrato:</b>	DM 002/18		
<b>Tipo de inversión:</b>	Directo Municipal	<b>Contratista:</b>	I.C. Ángel de Jesús Ramírez Guardado		
<b>Programa:</b>	U9 Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo Regional	<b>Inicio Vigente:</b>	miércoles, 8 de agosto de 2018	<b>Días de Obra:</b>	120 DÍAS
<b>Subprograma:</b>	01, 03 Estudios y Proyectos, Servicios	<b>Inicio Real:</b>	miércoles, 8 de agosto de 2018	<b>Monto Contratado:</b>	\$39,556.00
<b>Residente:</b>	INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES	<b>Fin Vigente:</b>	miércoles, 5 de diciembre de 2018	<b>Monto Ejercido:</b>	\$39,556.00
		<b>Fin Real:</b>	jueves, 6 de diciembre de 2018		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	13/08/2018	7.50%	8.50%	0%
2	20/08/2018	12.80%	13.50%	0%
3	27/08/2018	19.06%	20.00%	0%
4	03/09/2018	23.46%	25.00%	0%
5	10/09/2018	27.86%	28.00%	0%
6	17/09/2018	34.16%	35.15%	0%
7	24/09/2018	38.56%	39.00%	0%
8	01/10/2018	42.96%	44.80%	0%
9	08/10/2018	47.36%	48.00%	0%
10	15/10/2018	53.67%	55.00%	0%
11	22/10/2018	58.06%	60.00%	0%
12	29/10/2018	62.46%	63.00%	0%
13	05/11/2018	66.66%	67.00%	0%
14	12/11/2018	71.26%	72.00%	0%
15	19/11/2018	77.57%	78.00%	0%
16	26/11/2018	81.96%	83.00%	0%
17	03/12/2018	88.36%	89.00%	0%
18	10/12/2018	100.00%	100.00%	0%
18	17/12/2018	100.00%	100.00%	100%

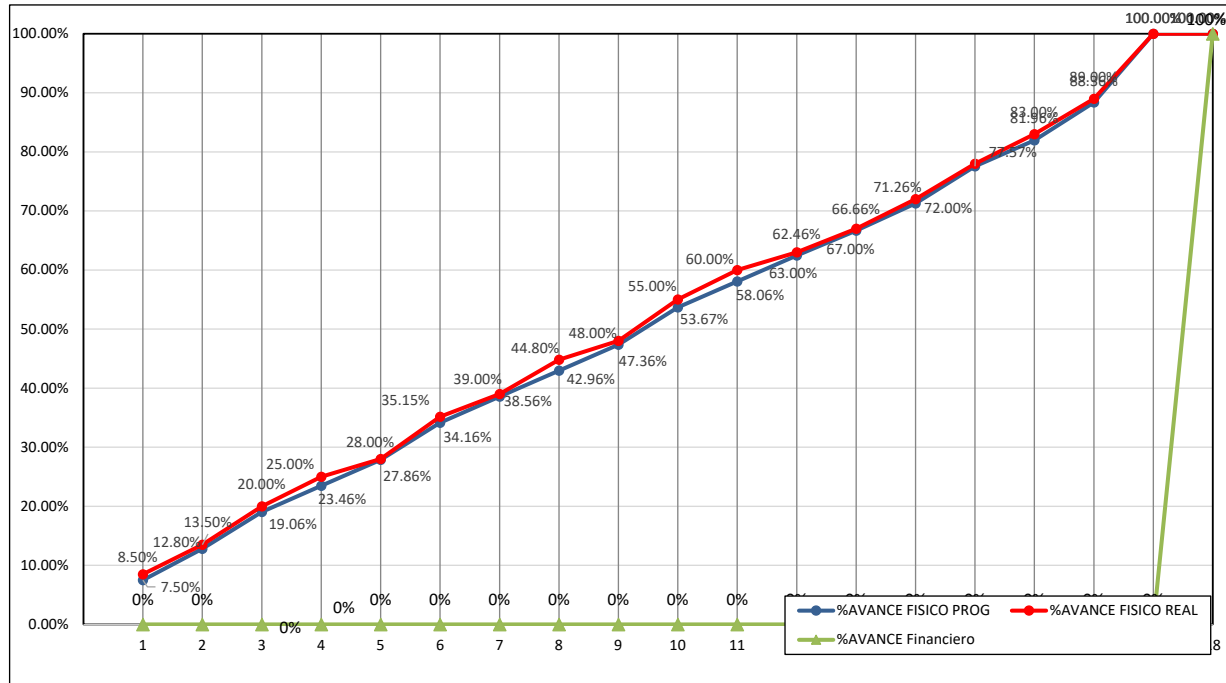

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
