

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA


Obra: DM 004/18 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE REBOMBEO EN PLANTA TRATADORA.-EX VIÑEDOS GUADALUPE; RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y BANQUETA EN LA CALLE 5 DE MAYO DESDE LA CALLE BENITO JUÁREZ HASTA CALLE EMILIANO ZAPATA Y EN LA CALLE NIÑOS HÉROES DESDE LA CALLE BENITO JUÁREZ HASTA LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE LA GUAYANA.

Ubicación: EX VIÑEDOS GUADALUPE Y LA GUAYANA.
Tipo de inversión: Directo Municipal
Programa: SF) PAVIMENTO EN COLONIAS POPULARES
Subprograma: RECONSTRUCCIÓN
Residente: INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES

Contrato: DM 006/18
Contratista: Constructora Flores Hermanos, S.A. de C.V.,
Inicio Vigente: sábado, 15 de septiembre de 2018
Inicio Real: sábado, 15 de septiembre de 2018
Fin Vigente: domingo, 14 de octubre de 2018
Fin Real: domingo, 14 de octubre de 2018

Días de Obra: 30 días
Monto Contratado: \$228,065.47
Monto Ejercido: \$226,670.55

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	17/09/2018	1.40%	3.00%	50%
2	24/09/2018	16.81%	18.00%	50%
3	01/10/2018	31.61%	35.00%	50%
4	08/10/2018	78.28%	79.00%	50%
5	15/10/2018	100.00%	100.00%	50%
6	22/10/2018	100.00%	100.00%	100%

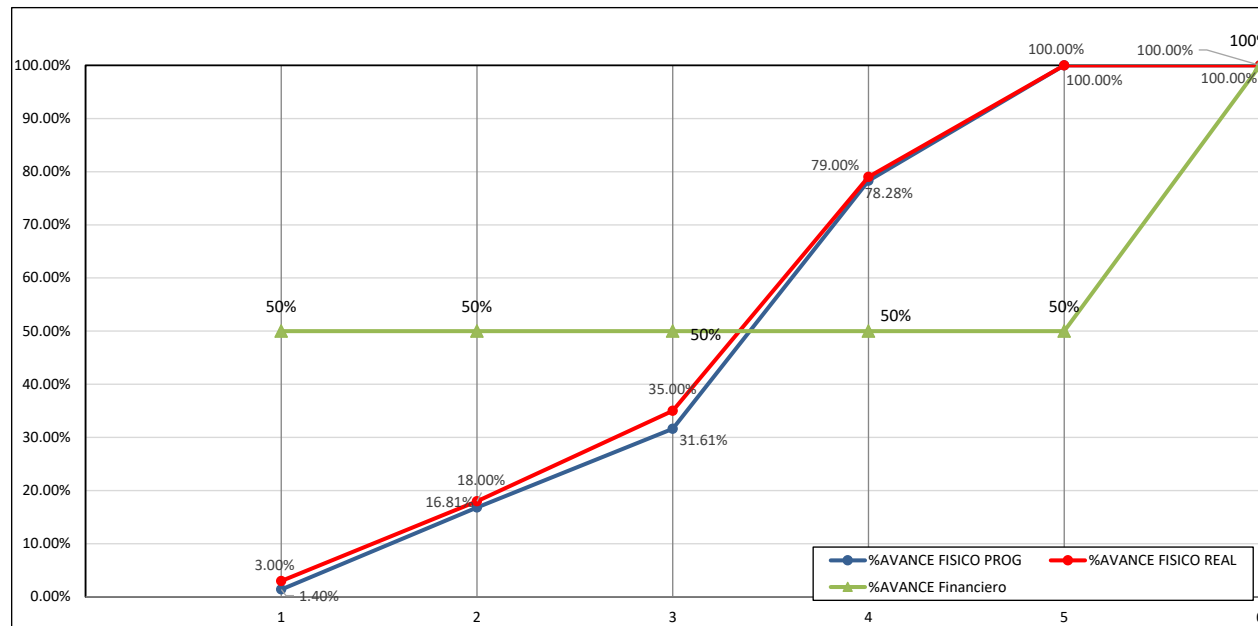

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
