

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FIS MDF 11-999 TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y PERITO RESPONSABLE DE LAS OBRAS: ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Ubicación: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Tipo de inversión: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

Contrato: FIS MDF 001/18

Programa: U9). DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES

Contratista: RAMIREZ GUARDADO, ANGEL DE JESUS, I.C.

Subprograma: 01). ESTUDIOS Y PROYECTOS

Inicio Vigente: viernes, 27 de abril de 2018

Días de Obra: 237 días

Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

Inicio Real: viernes, 27 de abril de 2018


Monto Contratado: \$199,810.00

Fin Vigente: sábado, 22 de diciembre de 2018

Monto Ejercido: \$199,810.00

Fin Real: jueves, 20 de diciembre de 2018

| SEMANA | FECHA | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 30/04/2018 | 5.20% | 8.20% | 0% |
| 2 | 07/05/2018 | 8.20% | 10.50% | 0% |
| 3 | 14/05/2018 | 10.50% | 12.30% | 0% |
| 4 | 21/05/2018 | 12.50% | 16.80% | 0% |
| 5 | 28/05/2018 | 18.30% | 20.50% | 0% |
| 6 | 04/06/2018 | 24.43% | 25.00% | 0% |
| 7 | 11/06/2018 | 27.78% | 28.01% | 0% |
| 8 | 18/06/2018 | 29.25% | 30.20% | 0% |
| 9 | 25/06/2018 | 30.73% | 30.80% | 0% |
| 10 | 02/07/2018 | 33.56% | 33.80% | 0% |
| 11 | 09/07/2018 | 36.96% | 37.00% | 0% |
| 12 | 16/07/2018 | 38.40% | 38.00% | 0% |
| 13 | 23/07/2018 | 41.25% | 42.00% | 0% |
| 14 | 30/07/2018 | 42.73% | 43.00% | 0% |
| 15 | 06/08/2018 | 46.06% | 47.00% | 0% |
| 16 | 13/08/2018 | 49.93% | 50.00% | 0% |
| 17 | 20/08/2018 | 50.40% | 51.00% | 0% |
| 18 | 27/08/2018 | 51.58% | 52.00% | 0% |
| 19 | 03/09/2018 | 53.35% | 54.00% | 0% |
| 20 | 10/09/2018 | 63.66% | 64.00% | 0% |
| 21 | 17/09/2018 | 66.37% | 67.00% | 0% |
| 22 | 24/09/2018 | 68.68% | 69.00% | 0% |
| 23 | 01/10/2018 | 72.57% | 73.00% | 0% |
| 24 | 08/10/2018 | 74.58% | 75.00% | 0% |
| 25 | 15/10/2018 | 75.99% | 77.00% | 0% |
| 26 | 22/10/2018 | 77.71% | 79.00% | 0% |
| 27 | 29/10/2018 | 81.60% | 83.00% | 0% |
| 28 | 05/11/2018 | 84.91% | 86.00% | 0% |
| 29 | 12/11/2018 | 86.62% | 88.00% | 0% |
| 30 | 19/11/2018 | 88.33% | 90.00% | 75% |
| 31 | 26/11/2018 | 92.22% | 94.00% | 75% |
| 32 | 03/12/2018 | 93.25% | 95.00% | 75% |
| 33 | 10/12/2018 | 93.53% | 97.00% | 75% |
| 34 | 17/12/2018 | 93.58% | 99.00% | 75% |
| 35 | 24/12/2018 | 100.00% | 100.00% | 100% |

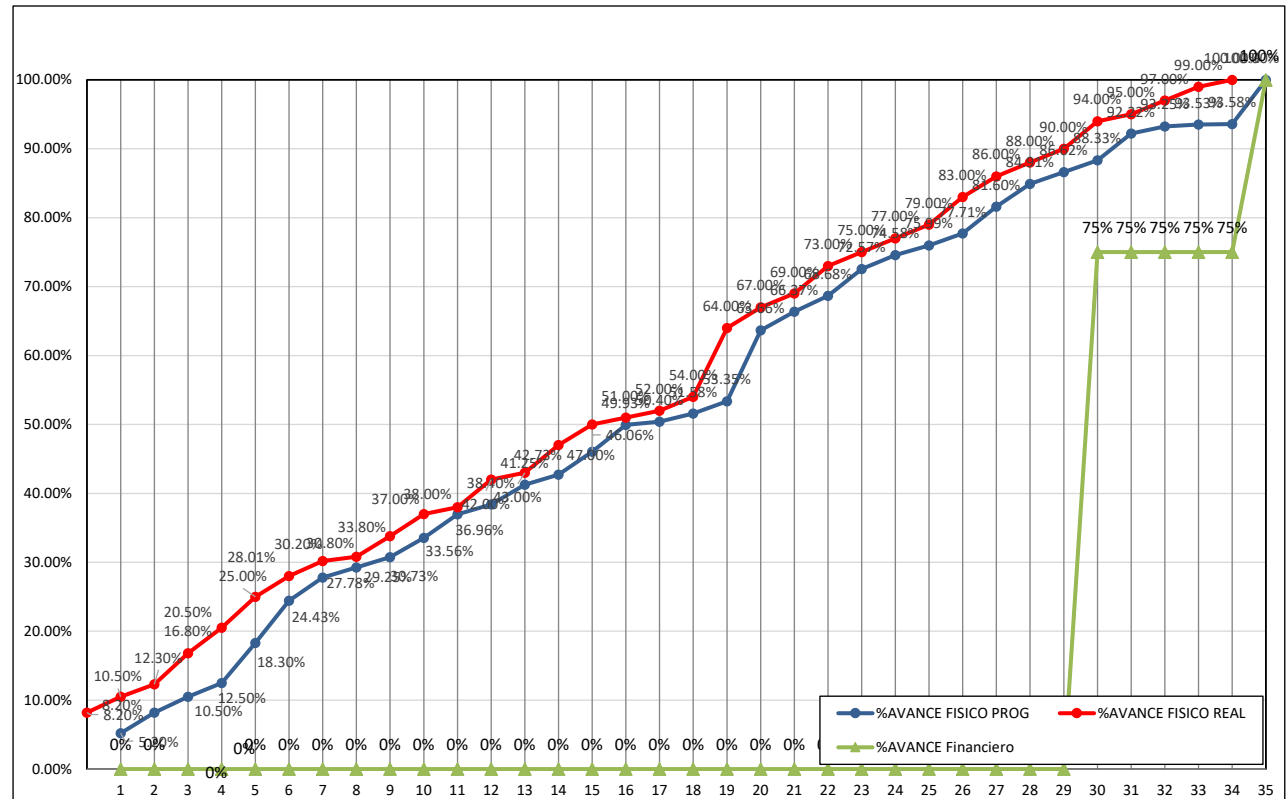

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
