

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FIS MDF 11-006 CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA


Ubicación: VARIAS COMUNIDADES
(LORETITO, FRACC. SAN JOSE DEL BARRANCO, FRACC.HIDALGO, CHICALOTE,
BORROTOS Y AMAPOLAS DEL RIO.

Contrato: FIS MDF 008/18

Tipo de inversión: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal
Programa: SH VIVIENDA DIGNA
Subprograma: 02 AMPLIACION DE VIVIENDA
Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

Contratista: BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
Inicio Vigente: viernes, 14 de diciembre de 2018
Inicio Real: viernes, 14 de diciembre de 2018
Fin Vigente: sábado, 29 de diciembre de 2018
Fin Real: jueves, 20 de diciembre de 2018
Días de Obra: 7 días
Monto Contratado: \$575,709.28
Monto Ejercido: \$575,709.28

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE FINANCIERO
1	17/12/2018	33.00%	82.00%	0%
2	24/12/2018	47.00%	100.00%	100%
2	31/12/2018	100.00%	100.00%	100%

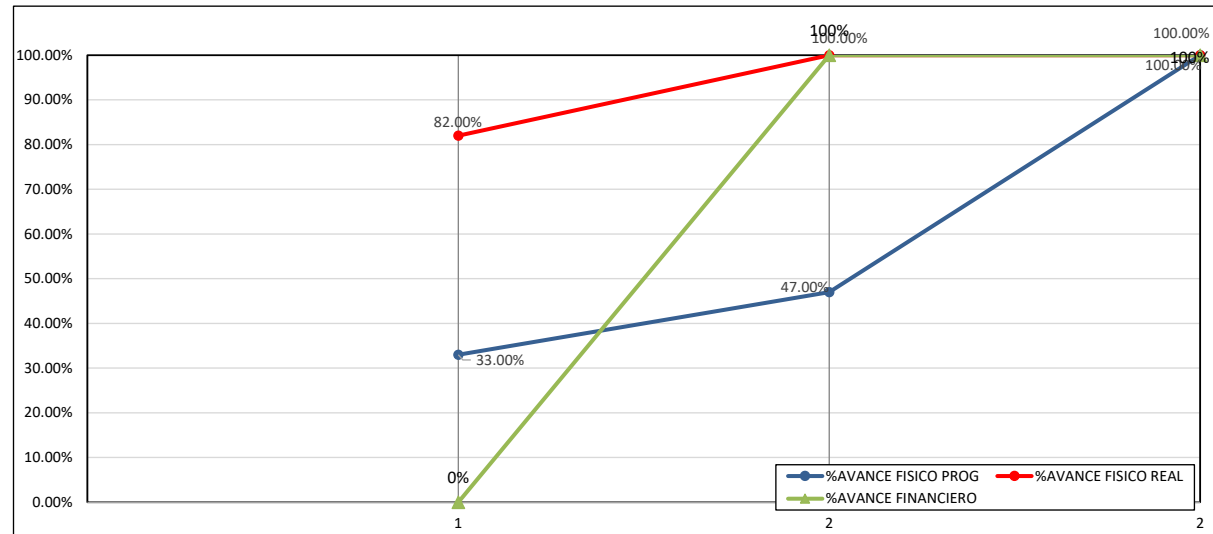

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
