


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: DM 005 REMODELACIÓN DE EDIFICIO EN COL. 28 DE ABRIL PARA ALBERGAR EL NUEVO CENTRO DE SALUD MENTAL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.
Ubicación: COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Tipo de inversión: PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2019
Programa: SO CENTRO DE SALUD
Subprograma: 01 REHABILITACION
Residente: INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES
Contrato: DM 002/19
Contratista: I.C. Cesar Alexis Muñoz Gómez
Inicio Vigente: miércoles, 13 de marzo de 2019
Inicio Real: miércoles, 13 de marzo de 2019
Fin Vigente: jueves, 11 de abril de 2019
Fin Real:
Días de Obra: 30 DÍAS
Monto Contratado: \$391,732.53
Monto Ejercido:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	18/03/2019	7.05%	10.00%	0%
2	25/03/2019	30.63%	42.00%	0%
3	01/04/2019	62.09%	65.00%	0%
4	08/04/2019	83.36%		
5	15/04/2019	100.00%		

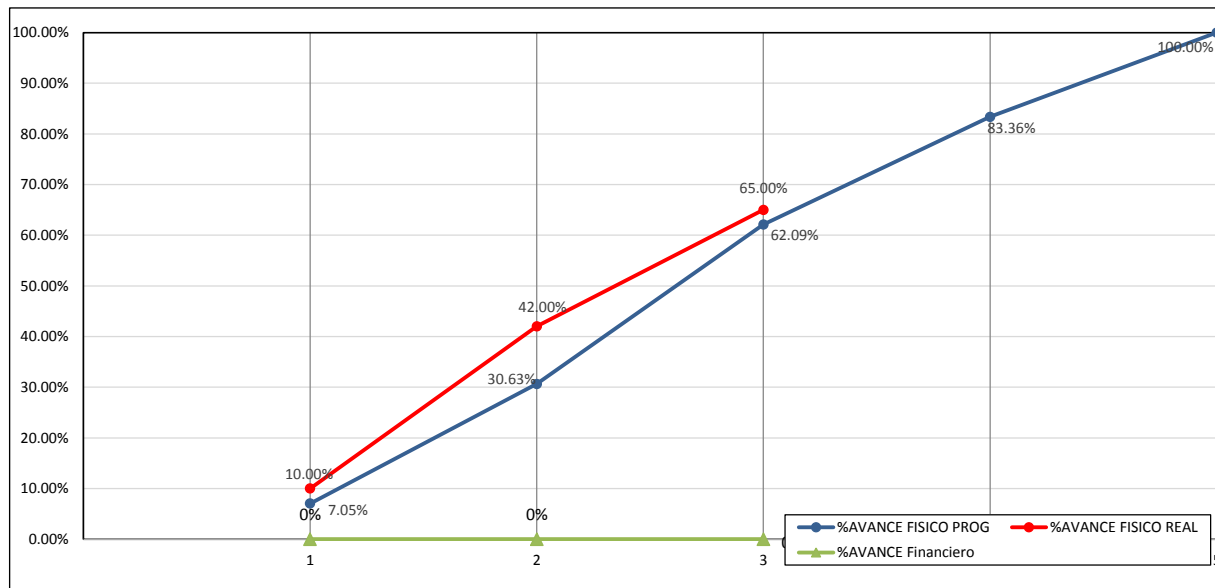

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

|
