

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** Servicio de Diseño, Arquitectura, de Ingeniería y Relaciones Relacionadas.  
(Elaboración de Proyecto Ejecutivo Estructural y Estudio de Mecánica de Suelos de Velaria en Plaza de la Comunidad La Escondida, San Francisco de los Romo, Ags.)

**Ubicación:** Todo el Municipio

**Contrato:** DM 003/19

**Tipo de inversión:** Fondo Directo Municipal 2019

**Contratista:** Proyectos SIGMMA, S.A. de C.V.,

**Programa:** U9 Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo Regional

**Inicio Vigente:** miércoles, 13 de marzo de 2019

**Días de Obra:** 15 días

**Subprograma:** 01 Estudios y Proyectos

**Inicio Real:** miércoles, 13 de marzo de 2019

**Monto Contratado:** \$ 90,000.00


**Residente:** ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

**Fin Vigente:** miércoles, 27 de marzo de 2019

**Monto Ejercido:** \$ 90,000.00

**Fin Real:** miércoles, 27 de marzo de 2019

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	18/03/2019	77.80%	85.00%	0%
2	25/03/2019	98.80%	99.00%	100%
3	01/04/2019	100.00%	100.00%	100%

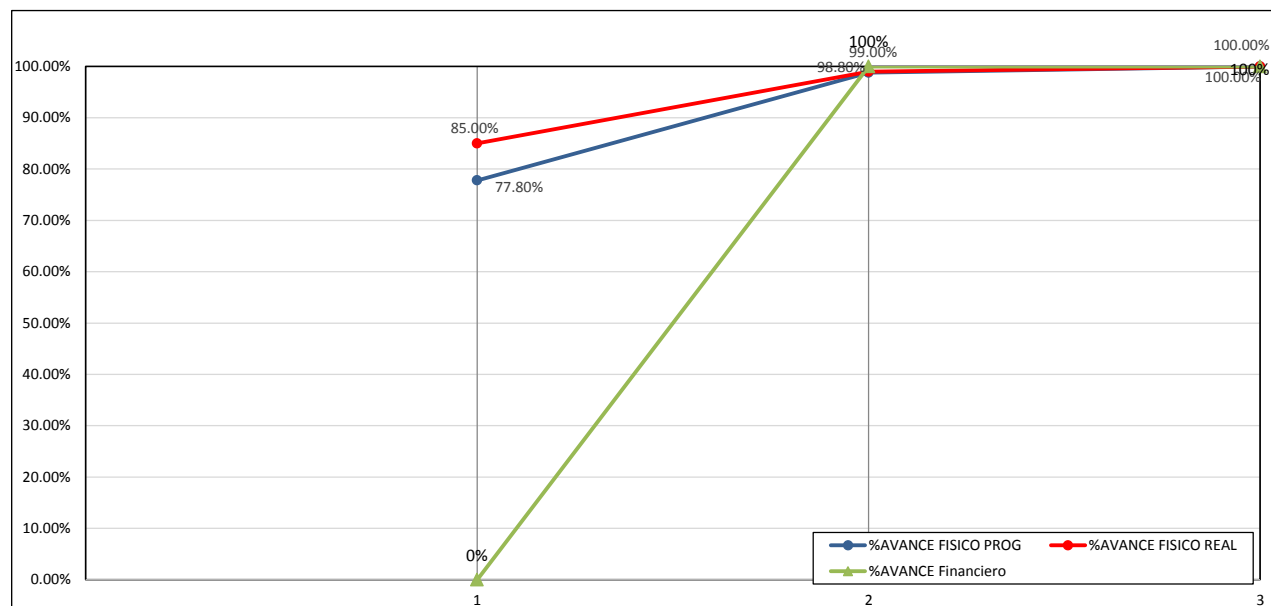

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
