

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 11-999 TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y PERITO RESPONSABLE DE LAS OBRAS: ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Ubicación: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: FISMDF 001/19

Tipo de inversión: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

Contratista: RAMIREZ GUARDADO, ANGEL DE JESUS, I.C.

Programa: U9). DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES

Inicio Vigente: sábado, 16 de marzo de 2019

Días de Obra: 190 días

Subprograma: 01). ESTUDIOS Y PROYECTOS

Inicio Real: sábado, 16 de marzo de 2019

Monto Contratado: \$244,500.00


Residente:

Fin Vigente: sábado, 21 de septiembre de 2019

Monto Ejercido:

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	18/03/2019	25.00%	26.00%	0%
2	25/03/2019	29.00%	29.50%	0%
3	01/04/2019	30.14%	32.00%	0%
4	08/04/2019	31.26%		
5	15/04/2019	33.57%		
6	22/04/2019	34.71%		
7	29/04/2019	35.85%		
8	06/05/2019	38.13%		
9	13/05/2019	40.41%		
10	20/05/2019	41.55%		
11	27/05/2019	43.83%		
12	03/06/2019	44.97%		
13	10/06/2019	47.25%		
14	17/06/2019	49.54%		
15	24/06/2019	50.66%		
16	01/07/2019	51.82%		
17	08/07/2019	54.10%		
18	15/07/2019	58.25%		
19	22/07/2019	63.18%		
20	29/07/2019	67.67%		
21	05/08/2019	69.17%		
22	12/08/2019	71.97%		
23	19/08/2019	76.17%		
24	26/08/2019	78.98%		
25	02/09/2019	81.77%		
26	09/09/2019	85.97%		
27	16/09/2019	90.17%		
28	23/09/2019	100.00%		

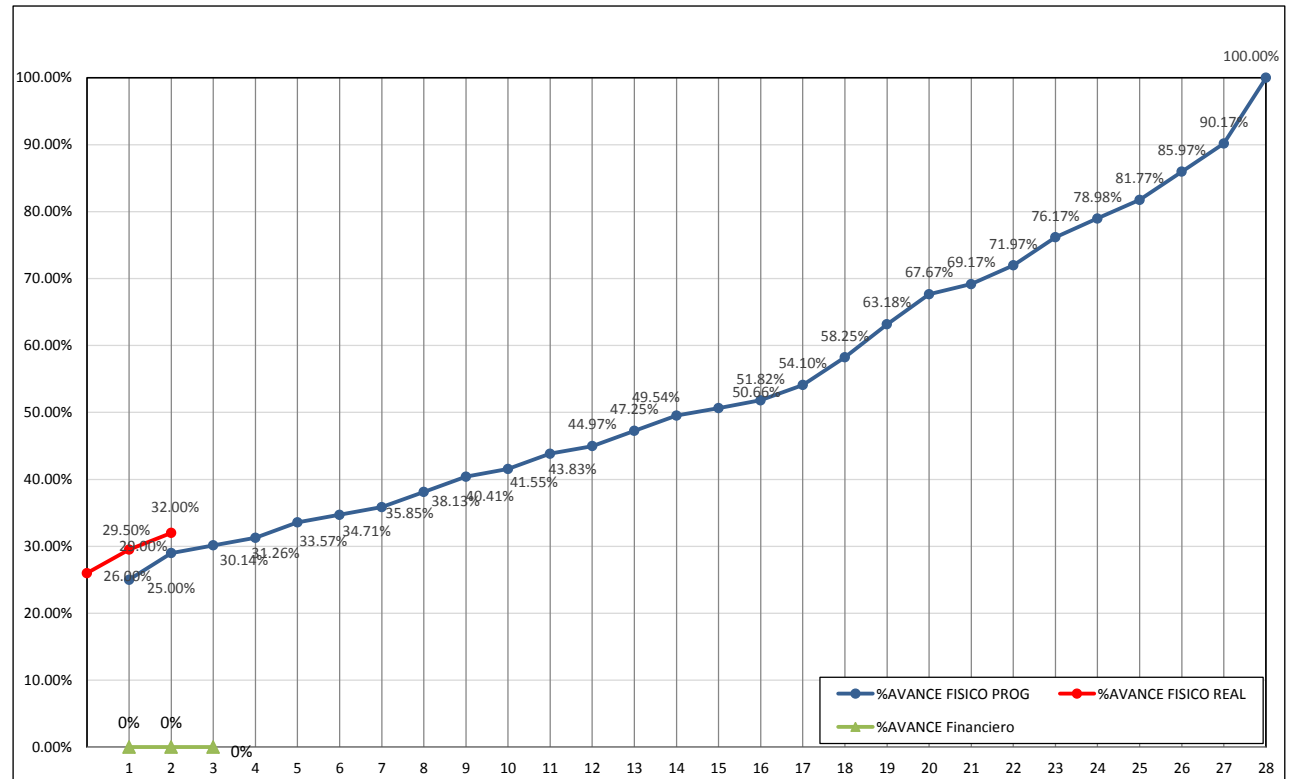

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
