

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FIS MDF 11-999 Gastos Indirectos (Elaboración de Proyecto Ejecutivo Estructural de Velaría para uso en Escuelas del Municipio de San Francisco de los Romo).

Ubicación: Todo el Municipio

Contrato: FIS MDF 002/19

Tipo de inversión: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

Contratista: Proyectos SIGMMA, S.A. de C.V

Programa: U9 Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo Regional

Inicio Vigente: miércoles, 13 de marzo de 2019

Días de Obra: 9 días

Subprograma: 01 Estudios y Proyectos

Inicio Real: miércoles, 13 de marzo de 2019

Monto Contratado: \$47,019.01


Residente: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

Fin Vigente: miércoles, 27 de marzo de 2019

Monto Ejercido: \$47,019.01

Fin Real: jueves, 21 de marzo de 2019

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	18/03/2019	80.30%	95.00%	0.00%
2	25/03/2019	97.50%	100.00%	0.00%
3	01/04/2019	100.00%	100.00%	100.00%

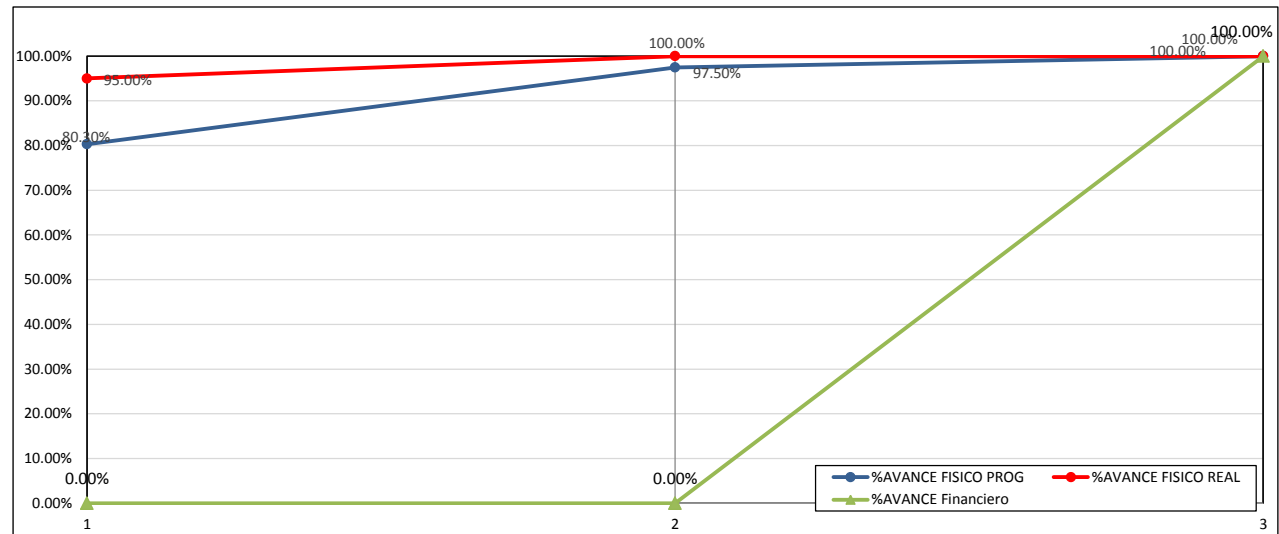

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
