


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	DM 003 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO	Contrato:	DM 004/19
Ubicación:	FRACC. MIGUEL HIDALGO	Contratista:	Mags Construcciones, S.A. de C.V.
Tipo de inversión:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2019	Inicio Vigente:	martes, 14 de mayo de 2019
Programa:	SE URBANIZACION	Inicio Real:	martes, 14 de mayo de 2019
Subprograma:	07, a) PARQUES Y JARDINES - REHABILITACIÓN	Fin Vigente:	viernes, 12 de julio de 2019
Residente:	I.C. Carlos Armando Chávez García	Fin Real:	
		Días de Obra:	60 DÍAS
		Monto Contratado:	\$1,467,000.00
		Monto Ejercido:	

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	17/05/2019	0.83%	2.50%	50%
2	24/05/2019	6.20%	10.00%	50%
3	31/05/2019	13.42%	18.00%	50%
4	07/06/2019	26.71%	35.00%	50%
5	14/06/2019	42.81%	44.00%	50%
6	21/06/2019	58.59%	61.00%	50%
7	28/06/2019	76.41%	78.50%	74%
8	05/07/2019	96.79%		
8	12/07/2019	100.00%		

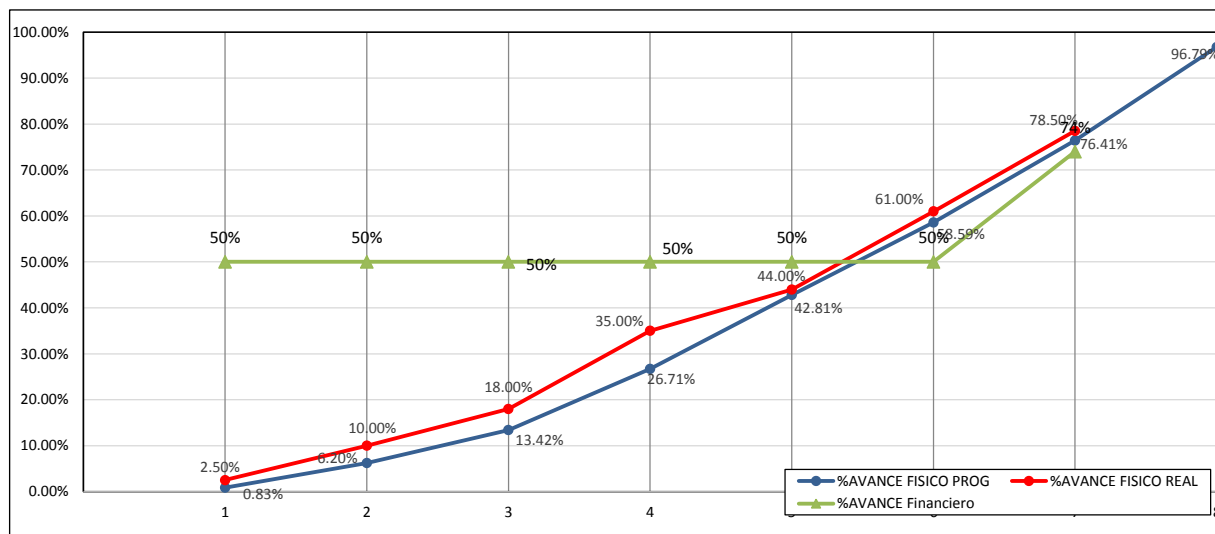

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

|
