


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: DM 004/19 REHABILITACIÓN DE PARQUE URBANO 1er. ETAPA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
Ubicación: LA ESCONDIDA **Contrato:** DM 005/19
Tipo de inversión: PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2019 **Contratista:** GCT Bajío Construcciones, S.A. de C.V
Programa: SE URBANIZACION **Inicio Vigente:** viernes, 03 de mayo de 2019 **Días de Obra:** 60 DÍAS
Subprograma: 07, a) PARQUES Y JARDINES - REHABILITACIÓN **Inicio Real:** viernes, 03 de mayo de 2019 **Monto Contratado:** \$1,277,342.70
Residente: I.C. Carlos Armando Chávez García **Fin Vigente:** lunes, 01 de julio de 2019 **Monto Ejercido:** \$1,321,018.36
Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	05/05/2019	1.68%	3.00%	50%
2	12/05/2019	9.56%	10.00%	50%
3	19/05/2019	20.28%	23.50%	50%
4	26/05/2019	34.11%	40.50%	67%
5	02/06/2019	47.94%	55.80%	67%
6	09/06/2019	61.77%	70.00%	67%
7	16/06/2019	91.30%	94.00%	67%
8	23/06/2019	96.94%	97.00%	91%
8	30/06/2019	99.87%	99.90%	91%
8	07/07/2019	100.00%	100.00%	

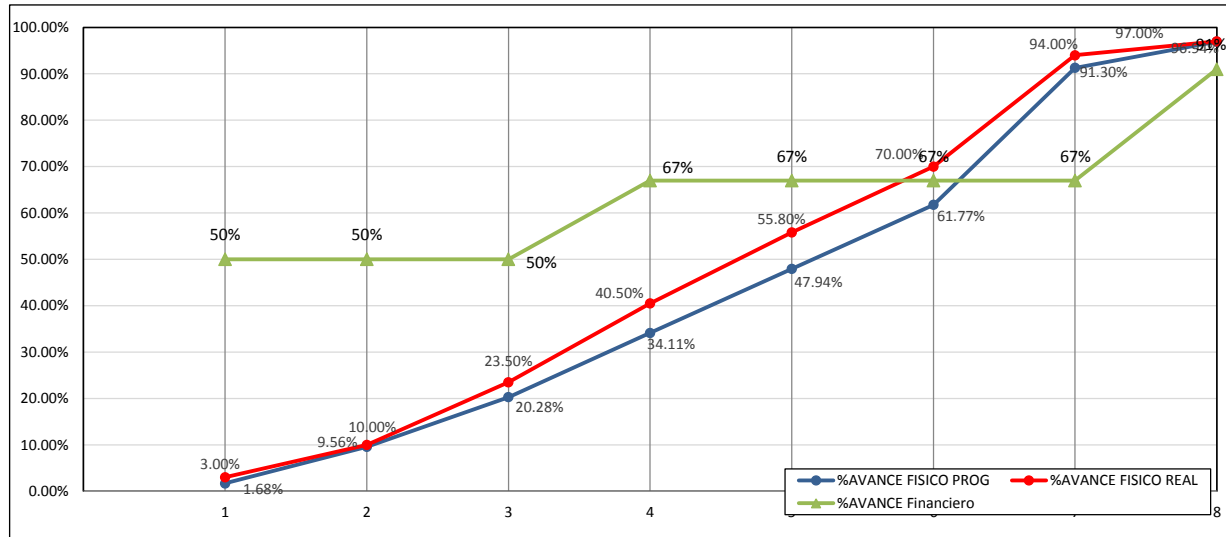

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

|
