


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

|                           |                                                              |                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Obra:</b>              | FR 001/19 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUET BOL |                          |
| <b>Ubicación:</b>         | LA CONCEPCIÓN                                                | <b>Contrato:</b>         |
| <b>Tipo de inversión:</b> | Programa Fondo Resarcitorio 2019                             | <b>Contratista:</b>      |
| <b>Programa:</b>          | SE URBANIZACION                                              | <b>Inicio Vigente:</b>   |
| <b>Subprograma:</b>       | 07, a) PARQUES Y JARDINES - REHABILITACIÓN                   | <b>Inicio Real:</b>      |
| <b>Residente:</b>         | Ing. J.Jesús Hernández Fuentes                               | <b>Fin Vigente:</b>      |
|                           |                                                              | <b>Fin Real:</b>         |
|                           |                                                              | <b>Días de Obra:</b>     |
|                           |                                                              | <b>Monto Contratado:</b> |
|                           |                                                              | <b>Monto Ejercido:</b>   |

| SEMANA | FECHA      | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1      | 29/04/2019 | 0.47%               | 0.55%               | 50%                |
| 2      | 06/05/2019 | 2.74%               | 3.50%               | 50%                |
| 3      | 13/05/2019 | 8.39%               | 9.20%               | 50%                |
| 4      | 20/05/2019 | 23.85%              | 28.50%              | 50%                |
| 5      | 27/05/2019 | 38.76%              | 40.00%              | 50%                |
| 6      | 03/06/2019 | 53.57%              | 62.00%              | 60%                |
| 7      | 10/06/2019 | 74.63%              | 75.50%              | 60%                |
| 8      | 17/06/2019 | 94.71%              | 95.00%              | 60%                |
| 9      | 24/06/2019 | 98.90%              | 99.00%              | 70%                |
| 10     | 01/07/2019 | 100.00%             | 100.00%             | 70%                |

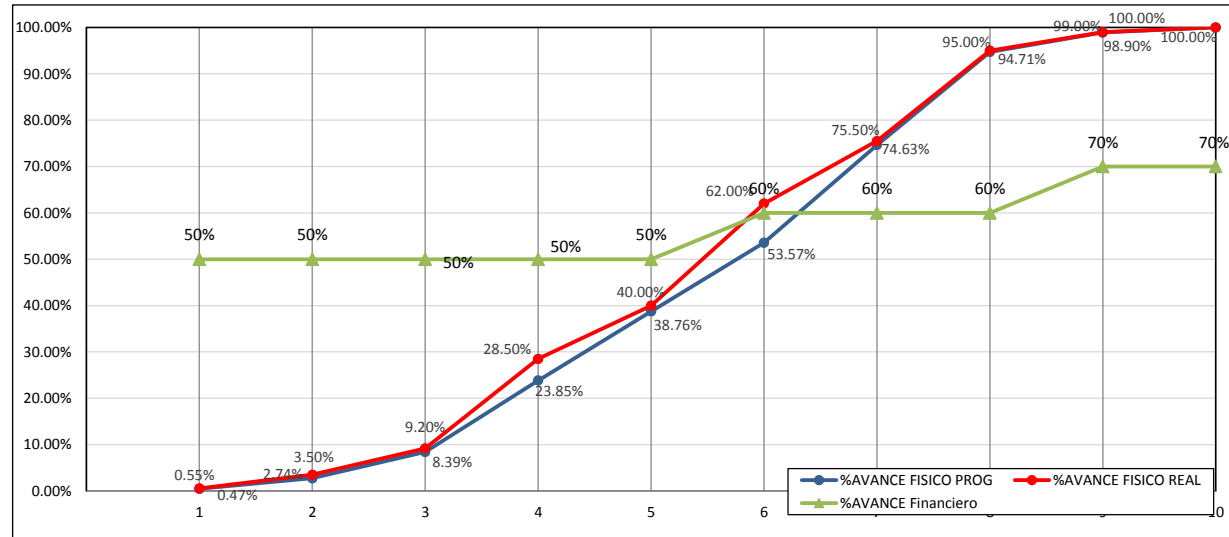

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

|
