

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FIS MDF 11-002 TECHUMBRE EN ETV No. 2 GUADALUPE VICTORIA,

Ubicación: PUERTECITO DE LA VIRGEN

Tipo de inversión: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Subprograma: 02, c) CONSTRUCCION c) SECUNDARIA

Residente: Ing. J.Jesús Hernández Fuentes

Contrato: FIS MDF 004/19

Contratista: Constructora Flores Hermanos, S.A. de C.V.,

Inicio Vigente: jueves, 30 de mayo de 2019

Inicio Real: jueves, 30 de mayo de 2019

Fin Vigente: domingo, 28 de julio de 2019


Fin Real:

Días de Obra: 60

Monto Contratado: \$1,009,194.99

Monto Ejercido:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	03/06/2019	1.40%	1.70%	50.00%
2	10/06/2019	5.82%	6.00%	50.00%
3	17/06/2019	26.08%	30.00%	50.00%
4	24/06/2019	43.88%	45.00%	50.00%
5	01/07/2019	54.96%	55.00%	50.00%
6	08/07/2019	74.76%		
7	15/07/2019	96.02%		
8	22/07/2019	97.78%		
9	29/07/2019	100.00%		

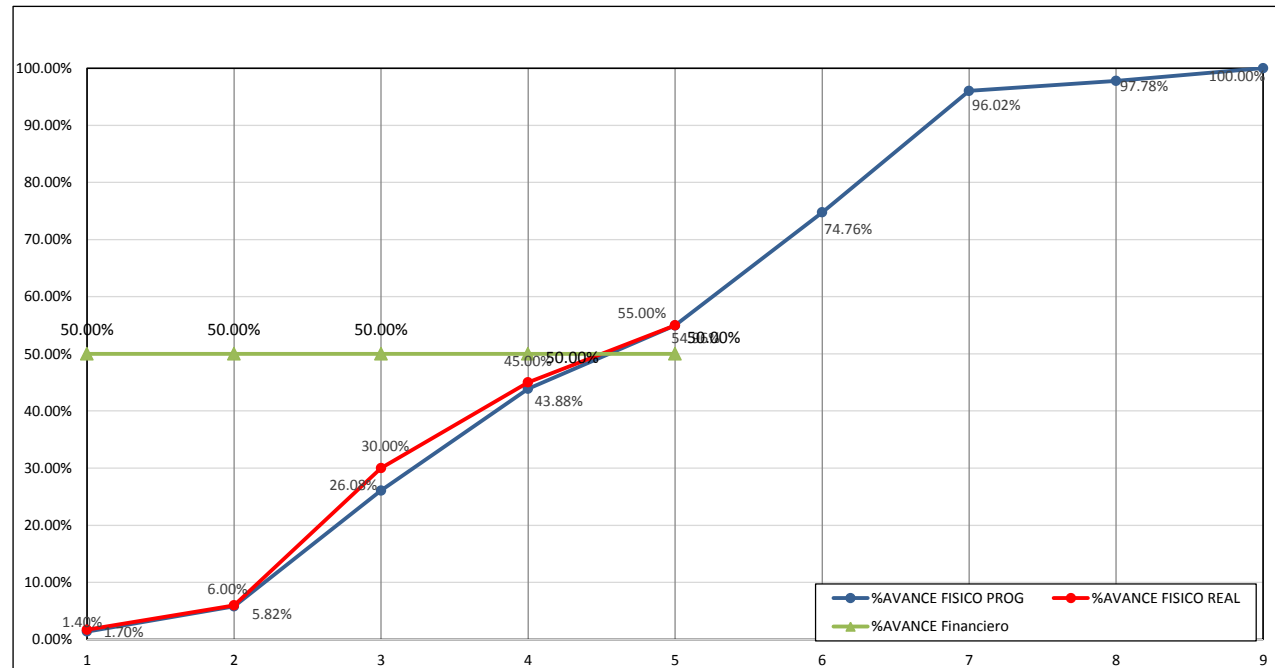

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
