

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FIS MDF 11-003 SERVICIOS SANITARIOS EN CECYTEA No. 3

Ubicación: FRACC. HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL

Tipo de inversión: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Subprograma: 02, d) CONSTRUCCION - OTROS NIVELES

Residente: I.C. Carlos Armando Chávez García

Contrato: FIS MDF 006/19

Contratista: I.C. Tereso Javier de la Peña Castillo

Inicio Vigente: lunes, 03 de junio de 2019

Inicio Real: lunes, 03 de junio de 2019

Fin Vigente: jueves, 01 de agosto de 2019


Fin Real:

Días de Obra: 60

Monto Contratado: \$1,343,951.42

Monto Ejercido:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	10/06/2019	2.29%	3.50%	50.00%
2	17/06/2019	9.90%	12.00%	50.00%
3	24/06/2019	27.58%	32.00%	57.00%
4	01/07/2019	42.51%		
5	08/07/2019	48.49%		
6	15/07/2019	64.29%		
7	22/07/2019	78.37%		
8	29/07/2019	91.53%		
9	05/08/2019	100.00%		

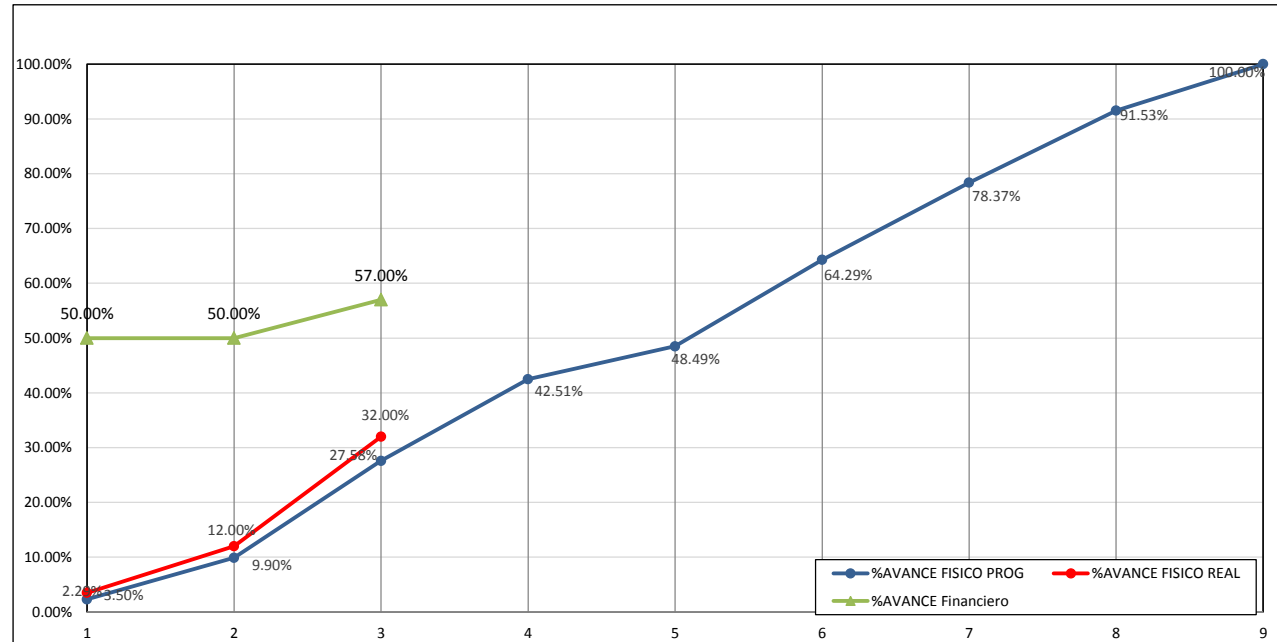

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
