

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA


**Obra:** COM 001/19 Rehabilitación de Colector Sanitario

**Ubicación:** El Panzazo  
**Tipo de inversión:** Convenio Organismo Operador del Agua y Municipio de San Francisco de los Romo  
**Programa:** SD Alcatarillado  
**Subprograma:** 01 Rehabilitación  
**Residente:** T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**Contrato:** COM 001/19  
**Contratista:** C. Ing. Roberto Silva Arjón  
**Inicio Vigente:** jueves, 26 de septiembre de 2019  
**Inicio Real:** jueves, 26 de septiembre de 2019  
**Fin Vigente:** domingo, 24 de noviembre de 2019  
**Fin Real:**

**Días de Obra:** 30 días  
**Monto Contratado:** \$ 1,289,565.36  
**Monto Ejercido:**

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/09/2019	11.64%	15.00%	0%
2	07/10/2019	16.18%		
3	14/10/2019	21.74%		
4	21/10/2019	33.06%		
5	28/10/2019	61.88%		
6	04/11/2019	75.88%		
7	11/11/2019	75.41%		
8	18/11/2019	84.00%		
9	25/11/2019	100.00%		

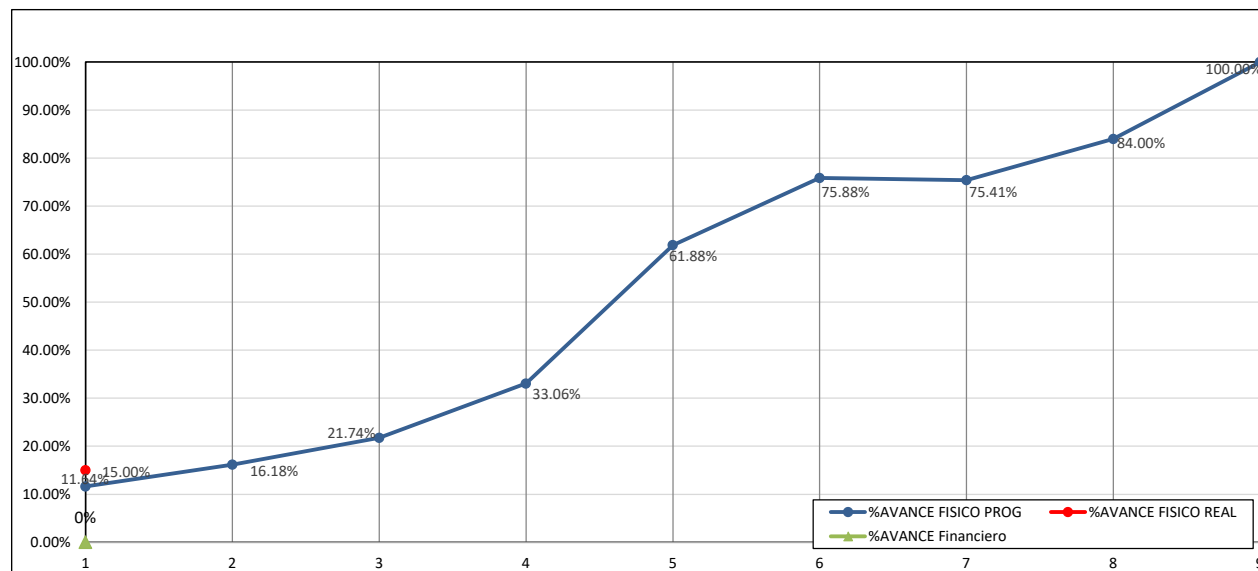

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
