


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: DM 001 BANQUETAS EN LA CALLE 21 DE MARZO COL. 28 DE ABRIL Y TRÁMITES ANTE LA CFE Y UNIDAD VERIFICADORA PARA LA CONEXIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COL. 28 DE ABRIL
Ubicación: CABECERA MUNICIPAL
Tipo de inversión: Directo Municipal
Programa: SE URBANIZACIÓN
Subprograma: 03, b) GUARNICIONES Y BANQUETAS - BANQUETAS
Residente: I.C. JESUS HERNANDEZ FUENTES

Contrato: DM 001/19
Contratista: Tereso Javier de la Peña Castillo, I.C.
Inicio Vigente: miércoles, 27 de febrero de 2019
Inicio Real: miércoles, 27 de febrero de 2019
Fin Vigente: miércoles, 13 de marzo de 2019
Fin Real: miércoles, 13 de marzo de 2019

Días de Obra: 15 días
Monto Contratado: \$120,940.15
Monto Ejercido: \$120,940.15

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	04/03/2019	10.50%	20.00%	0%
2	11/03/2019	54.50%	60.00%	0%
3	18/03/2019	100.00%	100.00%	100%

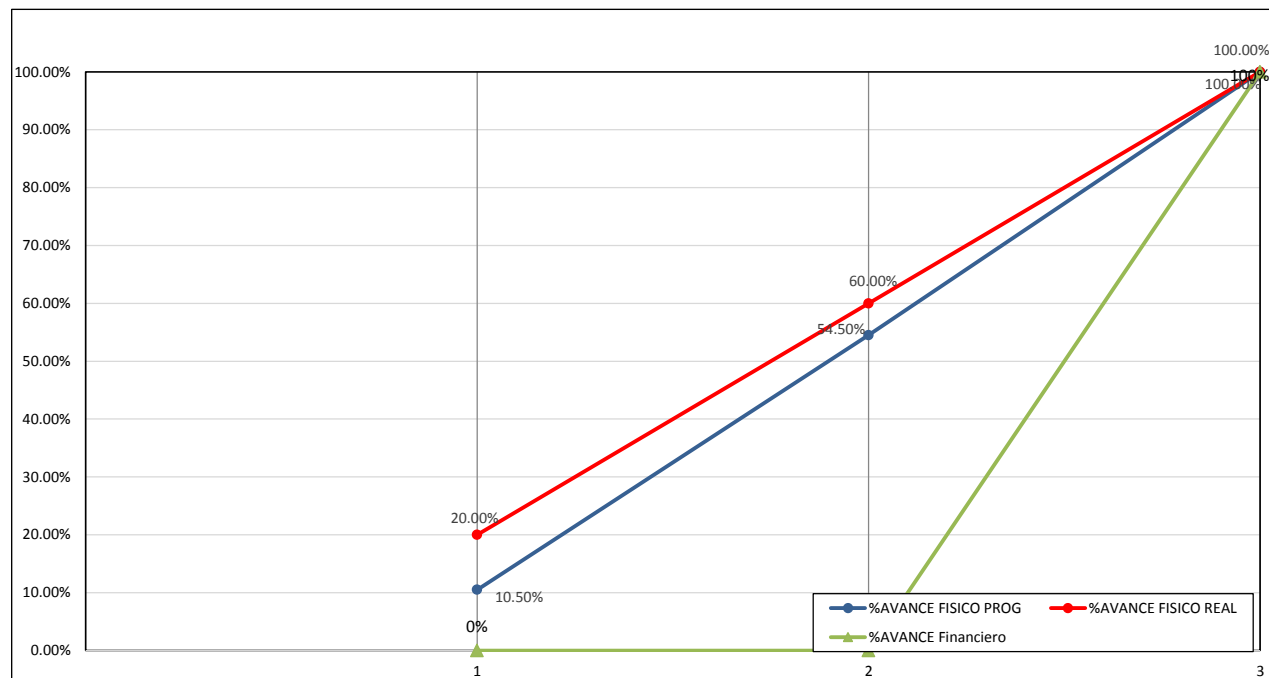

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
