


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: DM 005 REMODELACIÓN DE EDIFICIO EN COL. 28 DE ABRIL PARA ALBERGAR EL NUEVO CENTRO DE SALUD MENTAL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.		Contrato: DM 002/19	Días de Obra: 30 DÍAS
Ubicación: COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contratista: I.C. Cesar Alexis Muñoz Gómez	Inicio Vigente: miércoles, 13 de marzo de 2019	Monto Contratado: \$429,845.80
Tipo de inversión: PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2019	Inicio Real: miércoles, 13 de marzo de 2019	Fin Vigente: jueves, 11 de abril de 2019	Monto Ejercido: \$429,845.80
Programa: SO CENTRO DE SALUD	Fin Real: jueves, 11 de abril de 2019		
Subprograma: 01 REHABILITACION			
Residente: INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES			

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	18/03/2019	2.72%	12.00%	0%
2	25/03/2019	13.95%	32.00%	0%
3	01/04/2019	40.10%	55.00%	50%
4	08/04/2019	93.58%	95.00%	50%
5	15/04/2019	100.00%	100.00%	50%
6	22/04/2019	100.00%	100.00%	50%
7	29/04/2019	100.00%	100.00%	50%
8	06/05/2019	100.00%	100.00%	50%
9	13/05/2019	100.00%	100.00%	50%
10	20/05/2019	100.00%	100.00%	100%

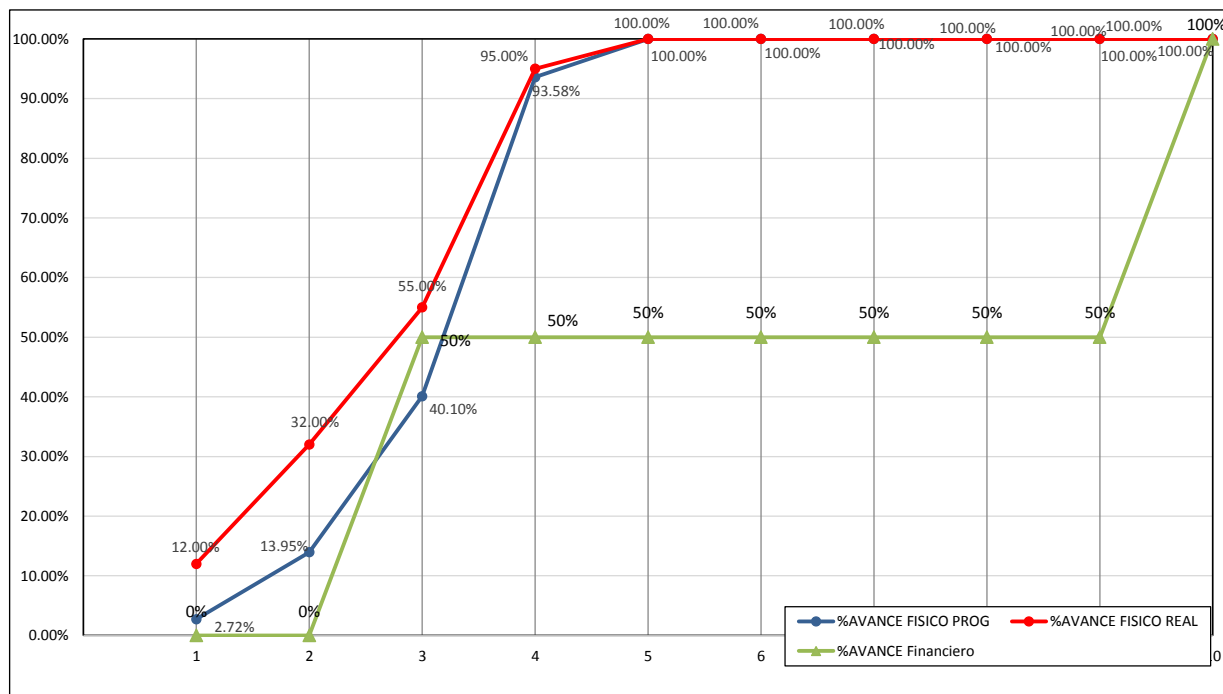

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

|
