

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: Servicio de Diseño, Arquitectura, de Ingeniería y Relaciones Relacionadas.
(Elaboración de Proyecto Ejecutivo Estructural y Estudio de Mecánica de Suelos de Velaria en Plaza de la Comunidad La Escondida, San Francisco de los Romo, Ags.)

Ubicación: Todo el Municipio

Contrato: DM 003/19

Tipo de inversión: Fondo Directo Municipal 2019

Contratista: Proyectos SIGMMA, S.A. de C.V.,

Programa: Definición y conducción de la planeación del desarrollo regional

Inicio Vigente: miércoles, 13 de marzo de 2019

Días de Obra: 15 días

Subprograma: 01 Estudios y Proyectos

Inicio Real: miércoles, 13 de marzo de 2019

Monto Contratado: \$ 90,000.00


Residente: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

Fin Vigente: miércoles, 27 de marzo de 2019

Monto Ejercido: \$ 90,000.00

Fin Real: miércoles, 27 de marzo de 2019

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	18/03/2019	65.00%	85.00%	0%
2	25/03/2019	96.00%	99.00%	0%
3	01/04/2019	100.00%	100.00%	100%

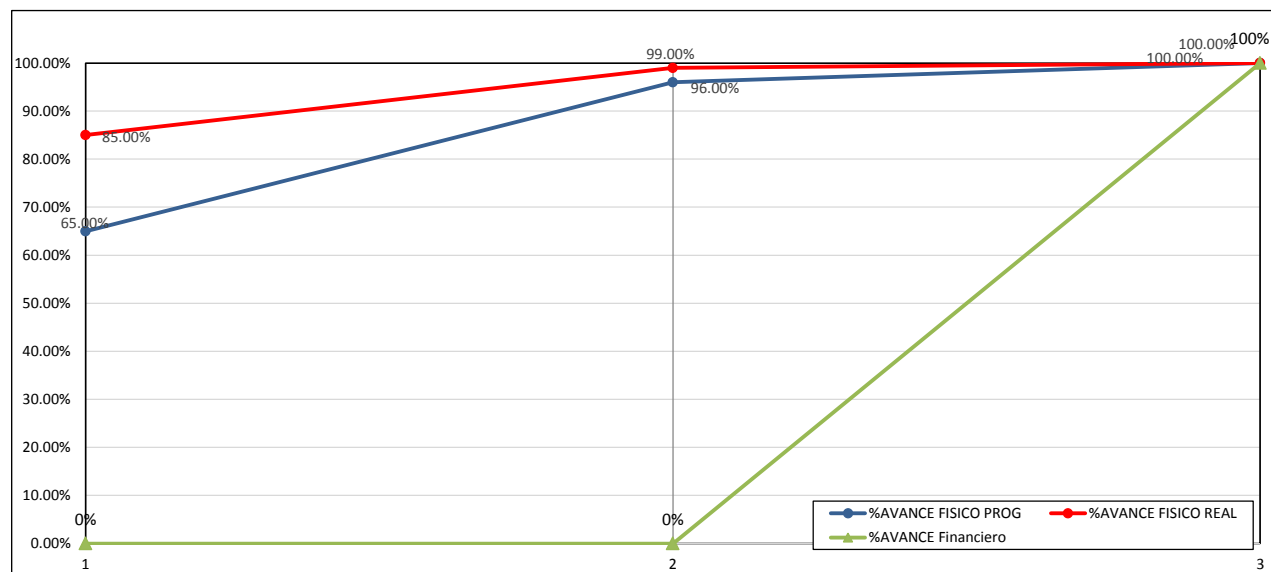

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
