

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: DM 006/19 EXTENSION DE RED SECUNDARIA

Obra:

Ubicación: LOS ARELLANO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: DM 006/19

Tipo de inversión: Fondo Directo Municipal 2019

Contratista: HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA, I.E.

Programa: SG ELECTRIFICACION

Inicio Vigente: miércoles, 10 de julio de 2019

Días de Obra: 15 días

Subprograma: 02 a) RURAL- CONSTRUCCIÓN

Inicio Real: miércoles, 10 de julio de 2019

Monto Contratado: \$ 127,148.15


Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

Fin Vigente: miércoles, 24 de julio de 2019

Monto Ejercido: \$ 127,148.15

Fin Real: miércoles, 24 de julio de 2019

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	16/07/2019	27.39%	38.00%	0%
2	23/07/2019	63.99%	72.00%	0%
3	30/07/2019	100.00%	100.00%	100%

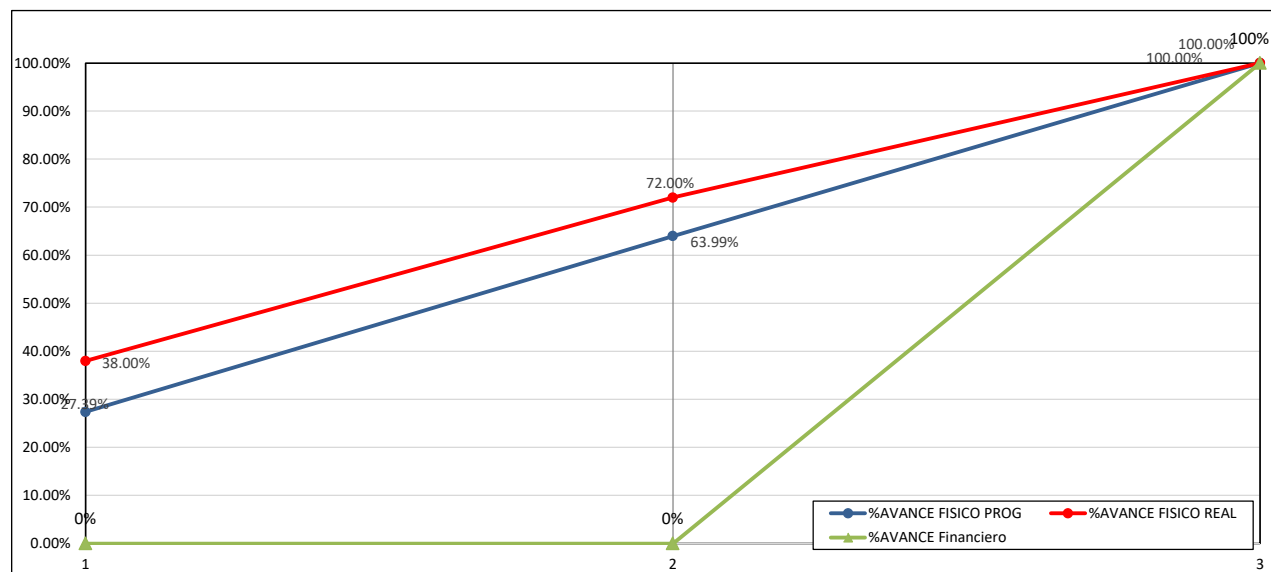

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
