

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

DM 007/19 REHABILITACIÓN DE ACCESO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN DIF MUNICIPAL

Obra:

Ubicación: CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Tipo de inversión: Fondo Directo Municipal 2019

Programa: DA EDIFICIOS PÚBLICOS

Subprograma: 01,03 REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN

Residente: ARQ. PREDO ANTONIO MEDINA FUENTES

Contrato: DM 007/19

Contratista: Proyectos Sigma, S.A. de C.V

Inicio Vigente: lunes, 9 de septiembre de 2019

Inicio Real: lunes, 9 de septiembre de 2019

Fin Vigente: martes, 8 de octubre de 2019


Fin Real:

Días de Obra: 30 días

Monto Contratado: \$ 1,157,144.40

Monto Ejercido:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	16/09/2019	8.86%	18.00%	50%
2	23/09/2019	36.40%	54.00%	50%
3	30/09/2019	66.21%		
4	07/10/2019	94.36%		
5	14/10/2019	100.00%		

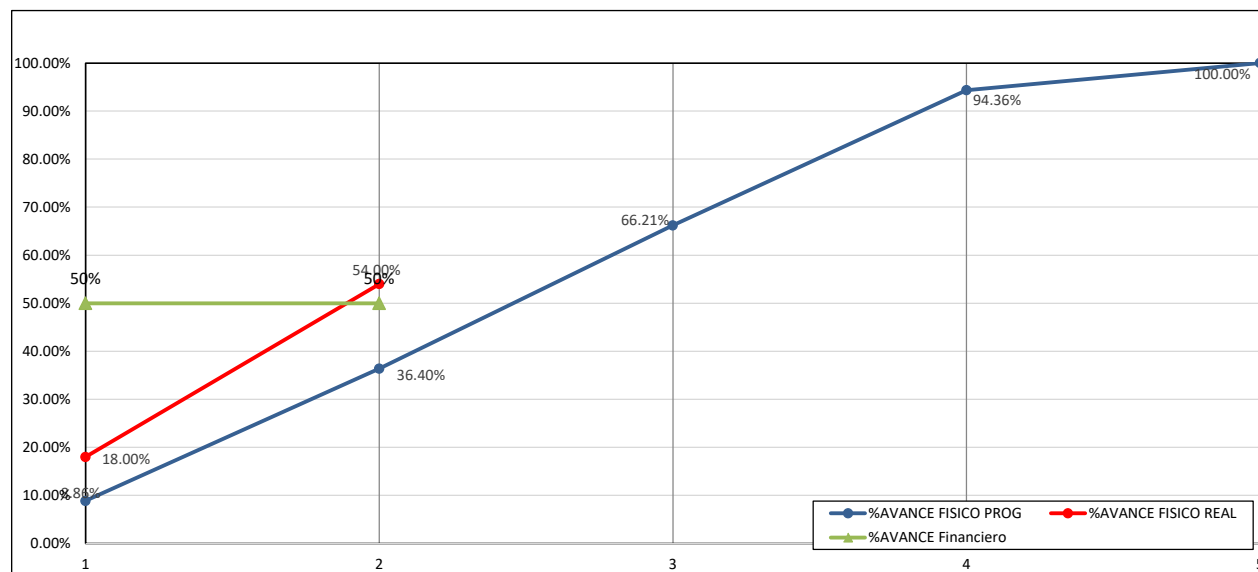

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
