

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: DM 012/19 Servicios De Diseño, Arquitectura, De Ingeniería Y Actividades Relacionadas (Trámite de Licencias de Construcción y Perito Responsable de las Obras: REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, MACARIO J. GOMEZ, REHABILITACIÓN DE ACCESO Y TECHUMBRE EN D.I.F. MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE (CAM XVI), CABECERA MUNICIPAL).

Ubicación: Todo el Municipio **Contrato:** DM 008/19

Tipo de inversión: Fondo Directo Municipal 2019 **Contratista:** Arq. Jesús Alejandro Gutiérrez Macías


Programa: U9 Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo Regional **Inicio Vigente:** viernes, 30 de agosto de 2019 **Días de Obra:** 45 días

Subprograma: 03 SERVICIOS **Inicio Real:** viernes, 30 de agosto de 2019 **Monto Contratado:** \$ 119,480.00

Residente: I.C. J. JESÚS HERNANDEZ FUENTES **Fin Vigente:** domingo, 13 de octubre de 2019 **Monto Ejercido:**

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	02/09/2019	16.70%	18.00%	0%
2	09/09/2019	33.40%	34.00%	0%
3	16/09/2019	50.10%	52.00%	0%
4	23/09/2019	66.80%	67.00%	0%
5	30/09/2019	83.50%		
6	07/10/2019	96.00%		
7	14/10/2019	100.00%		

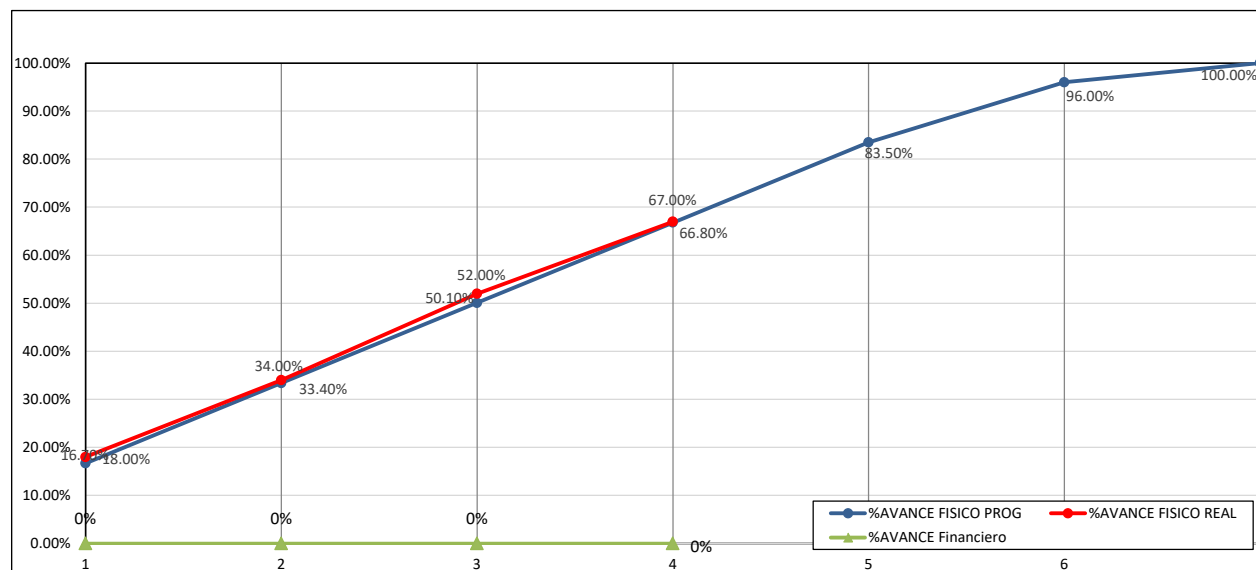

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
