

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: DR 001/19 Pintura en Complejo del Auditorio J. Guadalupe Posada

Ubicación: Cabecera Municipal

Tipo de inversión: Fondo Directo Municipal Remanente 2018

Programa: DA Edificios Públicos

Subprograma: 01 Rehabilitación

Residente: I.C. J. JESÚS HERNANDEZ FUENTES

Contrato: DR 001/19

Contratista: Materiales Triturados del Centro, S.A. de C.V.,

Inicio Vigente: sábado, 14 de septiembre de 2019

Inicio Real: sábado, 14 de septiembre de 2019

Fin Vigente: domingo, 13 de octubre de 2019


Fin Real:

Días de Obra: 30 días

Monto Contratado: \$ 1,376,375.67

Monto Ejercido:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	16/09/2019	22.80%	25.00%	0%
2	23/09/2019	45.61%	50.00%	0%
3	30/09/2019	74.93%	75.00%	0%
4	07/10/2019	98.00%		
5	14/10/2019	100.00%		

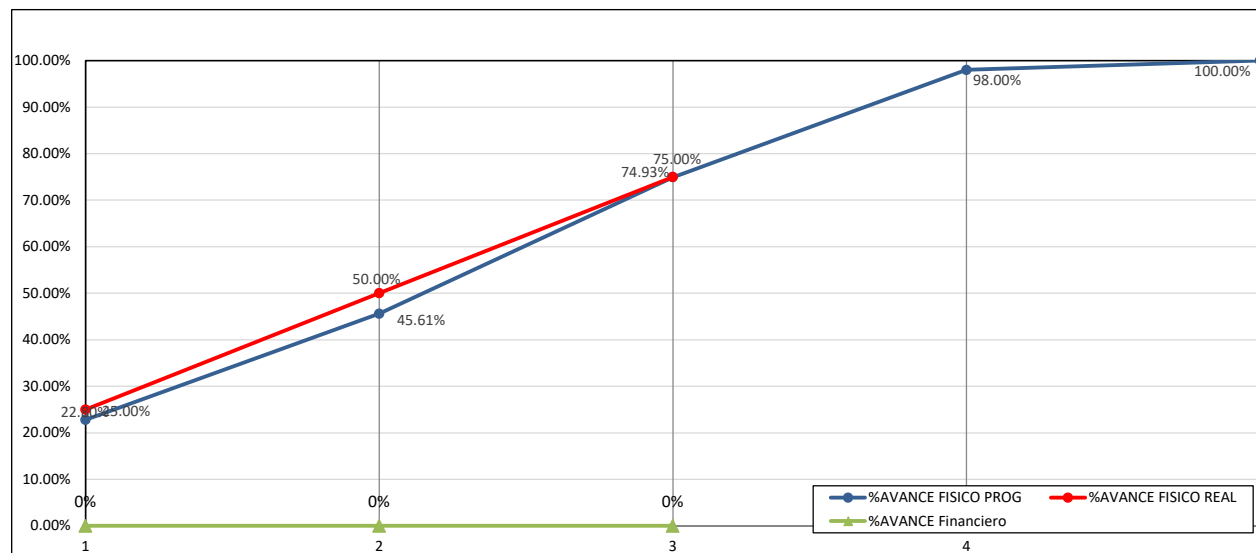

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
