


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

FR 001/19 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUET BOL

Obra:		
Ubicación:	LA CONCEPCIÓN	Contrato: FR 001/19
Tipo de inversión:	Programa Fondo Resarcitorio	Contratista: I.C. Cesar Enrique Peralta Plancarte
Programa:	SE URBANIZACION	Inicio Vigente: viernes, 26 de abril de 2019
Subprograma:	07, c) PARQUES Y JARDINES - CONSTRUCCIÓN	Días de Obra: 60 días
Residente:	I.C. J. JESÚS HERNANDEZ FUENTES	Monto Contratado: \$ 951,401.78
		Monto Ejercido: \$ 951,401.78
		Fin Vigente: lunes, 24 de junio de 2019
		Fin Real: lunes, 24 de junio de 2019

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	29/04/2019	1.73%	2.50%	50%
2	06/05/2019	6.59%	7.20%	50%
3	13/05/2019	21.90%	23.00%	50%
4	20/05/2019	37.59%	38.40%	50%
5	27/05/2019	50.80%	65.00%	50%
6	03/06/2019	71.83%	72.00%	60%
7	10/06/2019	92.86%	95.00%	60%
8	17/06/2019	99.89%	99.00%	60%
9	24/06/2019	100.00%	100.00%	70%
10	01/07/2019	100.00%	100.00%	70%
11	08/07/2019	100.00%	100.00%	70%
12	15/07/2019	100.00%	100.00%	70%
13	22/07/2019	100.00%	100.00%	70%
14	29/07/2019	100.00%	100.00%	100%

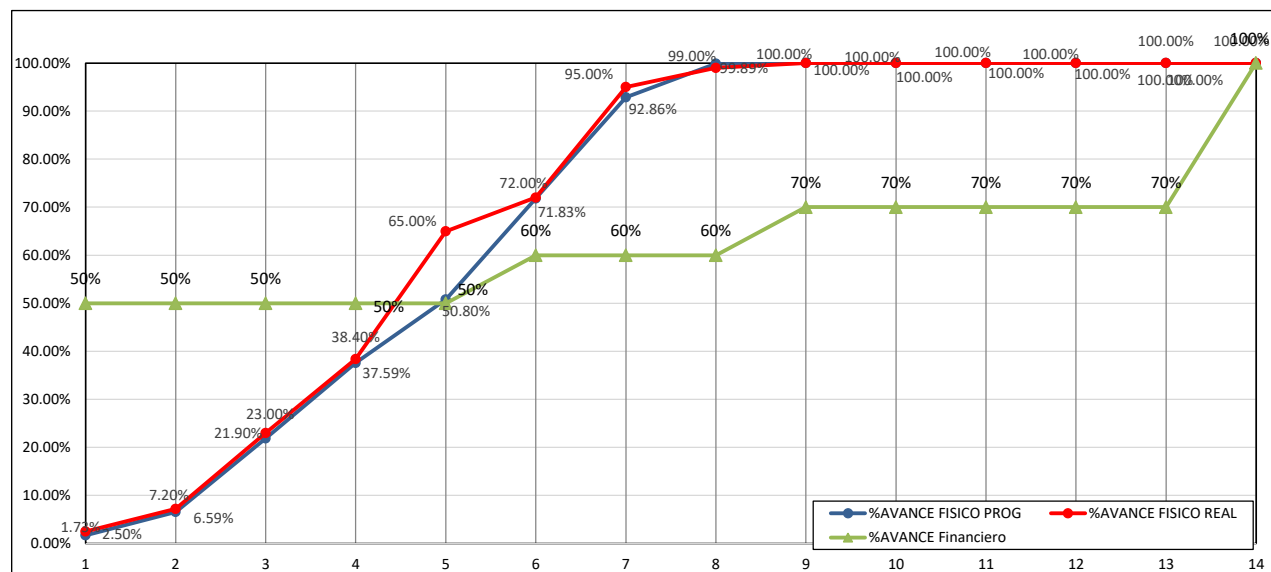

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
