

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FR 002/19 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA

Ubicación: MACARIO J. GÓMEZ

Tipo de inversión: Programa Fondo Resarcitorio

Programa: SL Infraestructura Educativa

Subprograma: 01 Rehabilitación

Residente: I.C. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Contrato: FR 002/19

Contratista: GCT Bajío Construcciones, S.A. de C.V.,

Inicio Vigente: lunes, 9 de septiembre de 2019

Días de Obra: 30 días

Inicio Real: lunes, 9 de septiembre de 2019


Monto Contratado: \$ 1,376,375.67

Fin Vigente: martes, 8 de octubre de 2019

Monto Ejercido:

Fin Real:

| SEMANA | FECHA | %AVANCE FÍSICO PROG | %AVANCE FÍSICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 16/09/2019 | 7.24% | 12.00% | 50% |
| 2 | 23/09/2019 | 23.37% | 40.00% | 50% |
| 3 | 30/09/2019 | 47.43% | 58.00% | 50% |
| 4 | 07/10/2019 | 76.35% | | |
| 5 | 14/10/2019 | 100.00% | | |

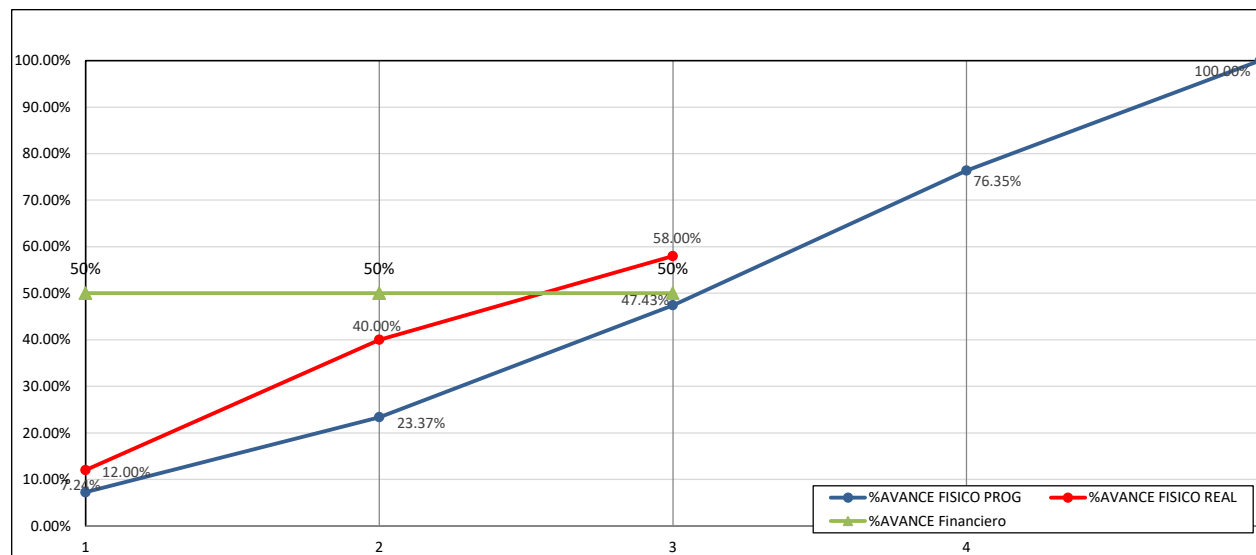

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
