

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FIS MDF 11-999 TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y PERITO RESPONSABLE DE LAS OBRAS: ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

**Ubicación:** MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Contrato:** FIS MDF 001/19

**Tipo de inversión:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

**Contratista:** RAMIREZ GUARDADO, ANGEL DE JESUS, I.C.

**Programa:** U9). DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES

**Inicio Vigente:** sábado, 16 de marzo de 2019

**Días de Obra:** 190 días

**Subprograma:** 01). ESTUDIOS Y PROYECTOS

**Inicio Real:** sábado, 16 de marzo de 2019

**Monto Contratado:** \$244,500.00


**Residente:**

**Fin Vigente:** lunes, 28 de octubre de 2019

**Monto Ejercido:**

**Fin Real:**

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	18/03/2019	10.50%	11.00%	0%
2	25/03/2019	18.20%	18.70%	0%
3	01/04/2019	20.30%	22.00%	0%
4	08/04/2019	25.00%	26.00%	0%
5	15/04/2019	29.00%	30.00%	0%
6	22/04/2019	30.14%	31.00%	0%
7	29/04/2019	31.26%	32.00%	0%
8	06/05/2019	33.57%	34.00%	0%
9	13/05/2019	34.71%	35.00%	0%
10	20/05/2019	35.85%	37.00%	0%
11	27/05/2019	38.13%	39.00%	0%
12	03/06/2019	40.41%	40.50%	0%
13	10/06/2019	41.55%	42.00%	0%
14	17/06/2019	43.83%	44.20%	0%
15	24/06/2019	44.97%	45.00%	0%
16	01/07/2019	47.25%	48.00%	0%
17	08/07/2019	49.54%	50.00%	0%
18	15/07/2019	50.66%	51.00%	0%
19	22/07/2019	51.82%	52.00%	0%
20	29/07/2019	54.10%	55.00%	0%
21	05/08/2019	58.25%	59.00%	0%
22	12/08/2019	63.18%	63.50%	0%
23	19/08/2019	67.67%	68.00%	0%
24	26/08/2019	69.17%	69.40%	0%
25	02/09/2019	71.97%	72.00%	0%
26	09/09/2019	76.17%	77.00%	0%
27	16/09/2019	78.98%	79.00%	0%
28	23/09/2019	81.77%	82.00%	0%
29	30/09/2019	85.97%		
30	07/10/2019	90.17%		
31	14/10/2019	92.10%		
32	21/10/2019	98.50%		
33	28/10/2019	100.00%		

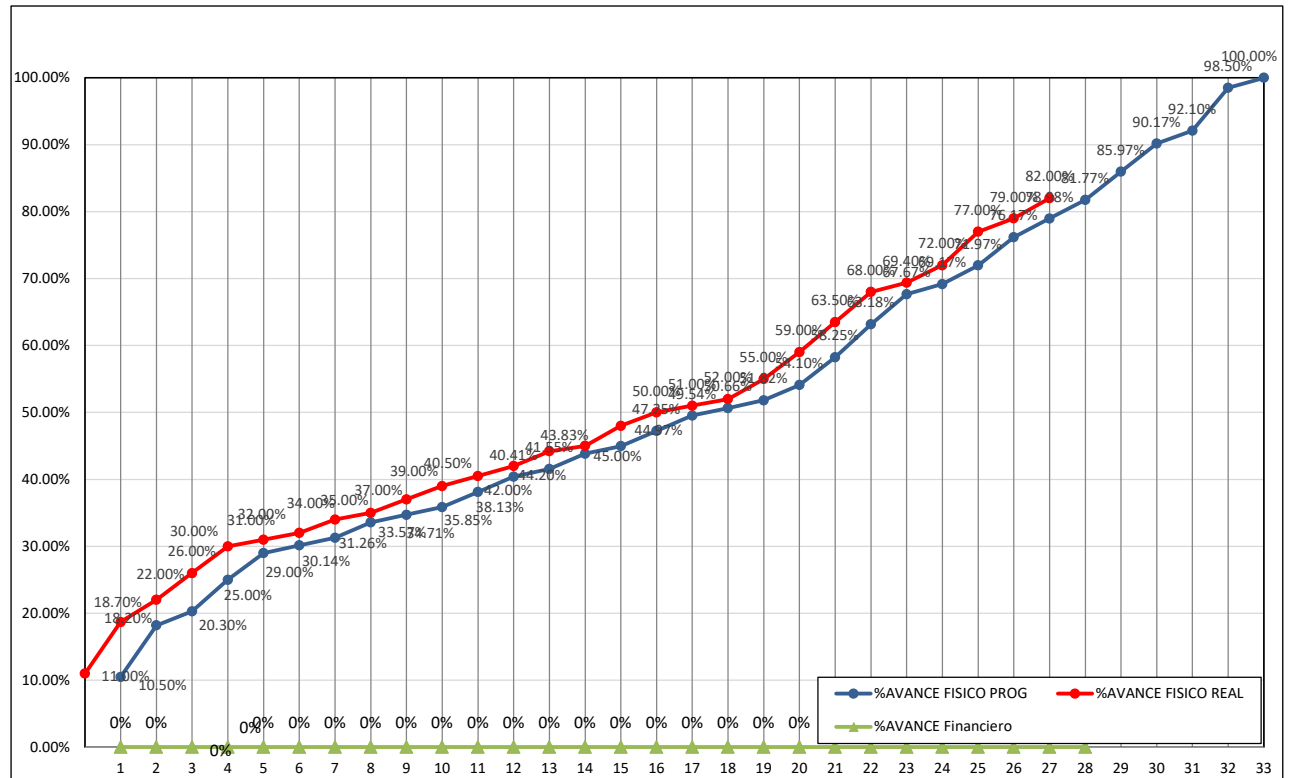

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
