

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FIS MDF 11-001 TECHUMBRE EN E.P. JOSÉ EFREN GARCÍA ESPARZA, COL. LOS CEDROS Y CONCLUSIÓN DE TECHUMBRE JN ALI CHUMACERO, URBIVILLA

Ubicación: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: FIS MDF 003/19

Tipo de inversión: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

Contratista: Arvil Construcciones, S.A. de C.V.,

Días de Obra: 60 días

Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Inicio Vigente: martes, 23 de abril de 2019

Monto Contratado: \$1,082,280.00

Subprograma: 02, b) CONSTRUCCIÓN a) PREESCOLAR b) PRIMARIA

Inicio Real: martes, 23 de abril de 2019


Monto Ejercido: \$1,082,280.00

Residente: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

Fin Vigente: viernes, 21 de junio de 2019

Fin Real: viernes, 21 de junio de 2019

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	29/04/2019	4.38%	10.00%	50%
2	06/05/2019	12.79%	18.00%	53%
3	13/05/2019	24.73%	35.00%	53%
4	20/05/2019	34.47%	40.00%	53%
5	27/05/2019	46.24%	52.00%	59%
6	03/06/2019	59.70%	63.00%	62%
7	10/06/2019	71.85%	75.00%	62%
8	17/06/2019	87.42%	89.00%	73%
9	24/06/2019	100.00%	100.00%	73%
10	01/07/2019	100.00%	100.00%	73%
11	08/07/2019	100.00%	100.00%	97%
12	15/07/2019	100.00%	100.00%	100%

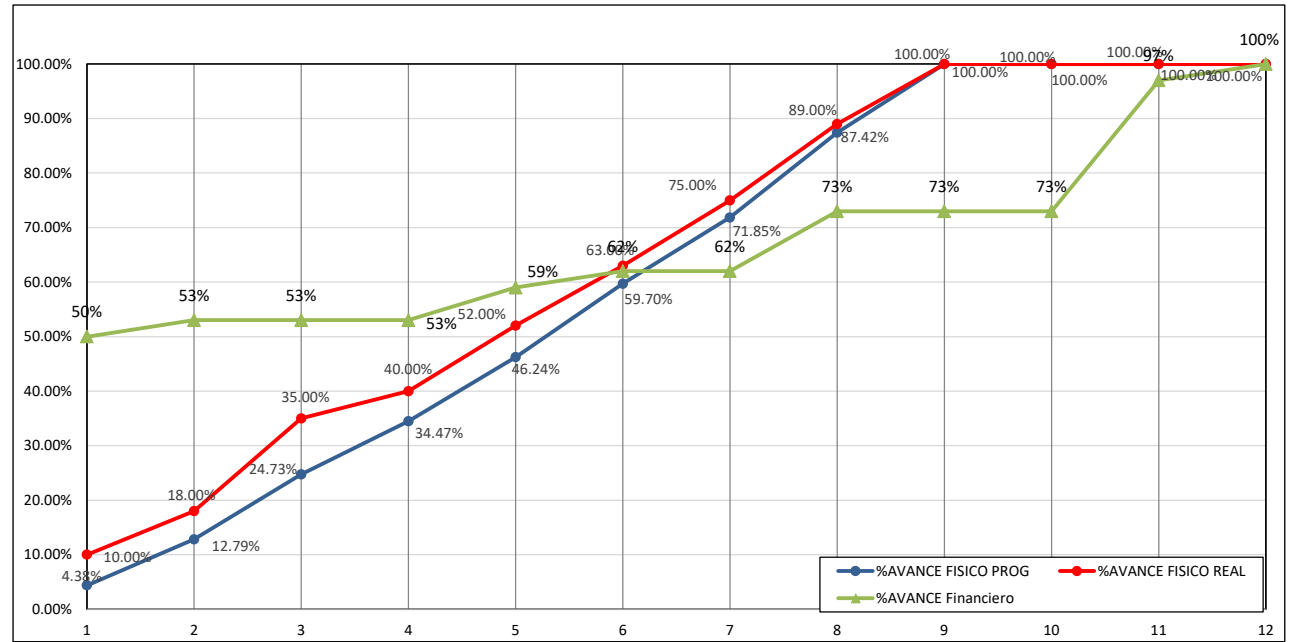

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
