

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA


Obra: FIS MDF 11-002 TECHUMBRE EN ETV No. 2 GUADALUPE VICTORIA,
Ubicación: PUERTECITO DE LA VIRGEN
Tipo de inversión: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México
Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Subprograma: 02, c) CONSTRUCCION c) SECUNDARIA
Residente: Ing. J.Jesús Hernández Fuentes

Contrato: FIS MDF 004/19

Contratista: Constructora Flores Hermanos, S.A. de C.V.,
Inicio Vigente: jueves, 30 de mayo de 2019
Inicio Real: jueves, 30 de mayo de 2019
Fin Vigente: domingo, 28 de julio de 2019
Fin Real: domingo, 28 de julio de 2019

Días de Obra: 60 días
Monto Contratado: \$1,009,194.99
Monto Ejercido: \$824,330.45

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	03/06/2019	1.40%	1.70%	50%
2	10/06/2019	5.82%	6.00%	50%
3	17/06/2019	26.08%	30.00%	50%
4	24/06/2019	43.88%	45.00%	50%
5	01/07/2019	54.96%	55.00%	67%
6	08/07/2019	74.76%	78.00%	67%
7	15/07/2019	96.02%	97.00%	67%
8	22/07/2019	97.78%	98.50%	67%
9	29/07/2019	100.00%	100.00%	67%
10	05/08/2019	100.00%	100.00%	67%
11	12/08/2019	100.00%	100.00%	67%
12	19/08/2019	100.00%	100.00%	67%
13	26/08/2019	100.00%	100.00%	67%
14	02/09/2019	100.00%	100.00%	67%
15	09/09/2019	100.00%	100.00%	67%
16	16/09/2019	100.00%	100.00%	82%

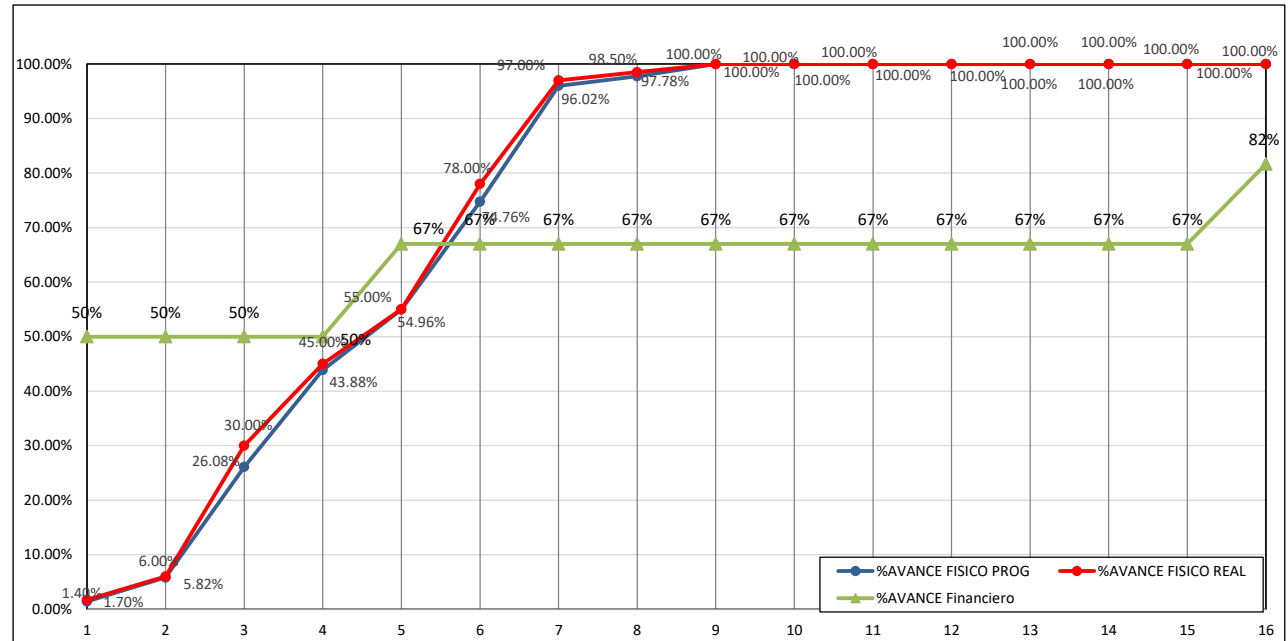

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
