

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: Gastos Indirectos , Estudio de Mecanica de Suelos para Sanitarios en Cecytea Plantel San Francisco de los Romo, Techumbre en ETV Guadalupe Victoria y C.P. Efrén García Esparza, con un Sondeo tipo SPT a 3mts de profundidad ejecutado con perforadora rotaria, realizando pruebas de penetración estandar a cada metro y recuperando muestras alteradas con muestreador hueco de pared gruesa).

Ubicación: Todo el Municipio

Tipo de inversión: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Subprograma: 02, c) CONSTRUCCION c) SECUNDARIA

Residente: Ing. J.Jesús Hernández Fuentes

Contrato: FISMDF 005/19

Contratista: Ingeniería Proyecto y Control de Obra, S. de R.L. de C.V.,

Inicio Vigente: miércoles, 10 de abril de 2019

Inicio Real: miércoles, 10 de abril de 2019

Fin Vigente: miércoles, 24 de abril de 2019


Fin Real: miércoles, 24 de abril de 2019

Días de Obra: 15

Monto Contratado: \$54,636.00

Monto Ejercido: \$54,636.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	14/04/2019	12.00%	15.00%	0.00%
2	21/04/2019	82.00%	85.00%	0.00%
3	28/04/2019	100.00%	100.00%	100.00%

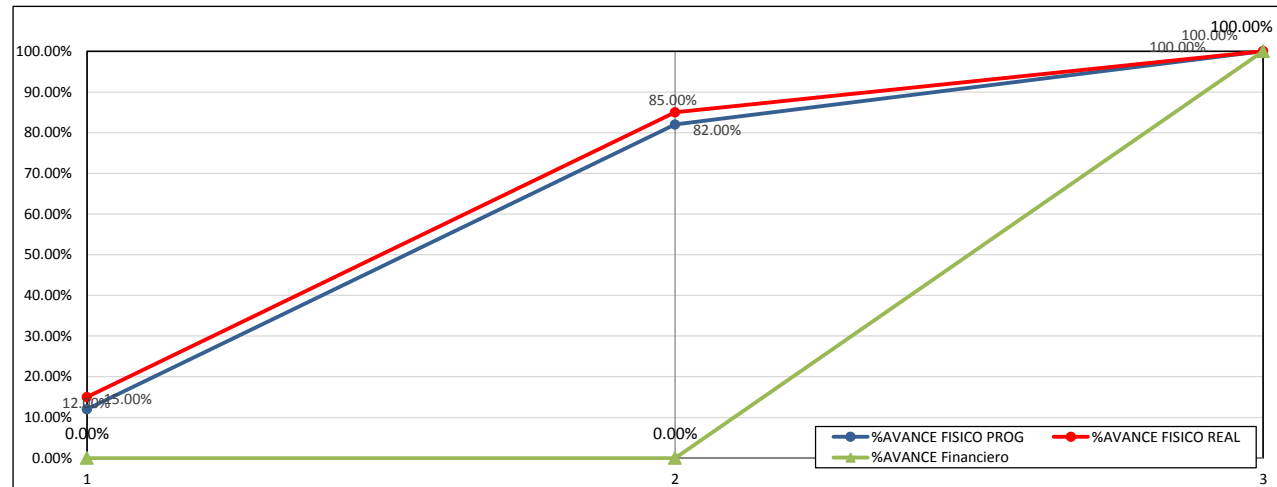

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
